
Onderwerp Voorgangsrapportage Investeringsagenda en Regiodeal regio Noord Limburg

Zaaknummer		Teammanager	Dorien van der Giessen
B & W datum	10 oktober 2023	Afdeling/Team	Concern
Naam steller	Roel Reijnders	Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Besproken met portefeuillehouder

Ja, met Wim de Schryver op 28 september 2023

Openbaarheid

Ja, na het informeren van betrokkenen.

Bevoegd orgaan

B en W

Ter kennisname aanbieden aan Commissie Werken en Besturen en Raad

ADVIES

1. In te stemmen met de Voortgangsrapportage Regio Noord-Limburg 2022 en de samenvatting voor de gemeenteraden (bijlage 1 en 2)
2. De raadsinformatiebrief zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen en deze inclusief de samenvatting van de voortgangsrapportage Regio Noord-Limburg (bijlage 2) te verzenden naar de gemeenteraad.

Inleiding

De Regio Noord-Limburg is een netwerksamenwerking van acht gemeenten. De Regio Noord-Limburg is geen juridische entiteit. Dat betekent dat alle formele besluitvormende bevoegdheden bij de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn belegd. Er zijn geen bevoegdheden overgedragen aan de samenwerking. Elk college verantwoordt de deelname aan de regionale samenwerking aan de eigen gemeenteraad. De gemeenteraden worden daarnaast via regionale bijeenkomsten en informatiebrieven op de hoogte gehouden van de regionale ontwikkelingen.

Beoogd resultaat

Inzicht in de voortgang van de projecten van de regio Noord Limburg in het kader van Investeringsagenda en de Regiodeal.

Argumenten

Vanuit colleges en gemeenteraden van de regiogemeenten is de behoefte uitgesproken om de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal en de Investeringsagenda te kunnen monitoren. De eerder opgestelde monitorings- en verantwoordingsrapportage bevatte weliswaar veel informatie, maar was erg complex voor gemeenteraadsleden, die vooral op zoek zijn naar de informatie die specifiek voor hun gemeente relevant is. Om die reden heeft het Regiobureau in samenwerking met bureau Berenschot een rapportage opgesteld die voldoet aan deze behoefte. Deze rapportage is als bijlage bij dit collegevoorstel toegevoegd en is tevens een bijlage bij de raadsinformatiebrief, zodat ook gemeenteraden de beschikking krijgen over de actuele voortgangsinformatie.

De rapportage heeft als doel om inzicht te geven in de voortgang van activiteiten en projecten (in hoeverre realiseren we de beoogde resultaten?), wat de bijdrage hiervan is aan de programmadoelen (liggen we op koers?) in relatie tot de ontwikkeling van de brede welvaart in Noord-Limburg. Op basis hiervan legt de regio jaarlijks verantwoording af aan het Rijk, de Provinciale Staten van Limburg, colleges en gemeenteraden over de besteding van middelen. De informatie helpt om waar nodig te kunnen bijsturen of nieuwe activiteiten en projecten te onderbouwen.

Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Regio Noord-Limburg 2022 (bijlage 1) en de samenvatting voor de gemeenteraden (bijlage 2). Ook wordt u voorgesteld om de raadsinformatiebrief (bijlage 3) vast te stellen en deze te verzenden naar de gemeenteraden.

Kanttekeningen of risico's

N.v.t.

Communicatie

Via bijgevoegde Rib en Samenvatting van de tussenrapportage de gemeenteraad informeren

Financiële gevolgen

N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

Voortgangsrapportage Investeringsagenda en Regiodeal regio Noord Limburg

Samenvatting voortgangsrapportage Investeringsagenda en Regiodeal regio Noord Limburg


Raadsinformatiebrief

Naslagwerk

N.v.t.

Voortgangsrapport Regio Deal en Investeringsagenda Gezondste Regio

15 augustus 2023

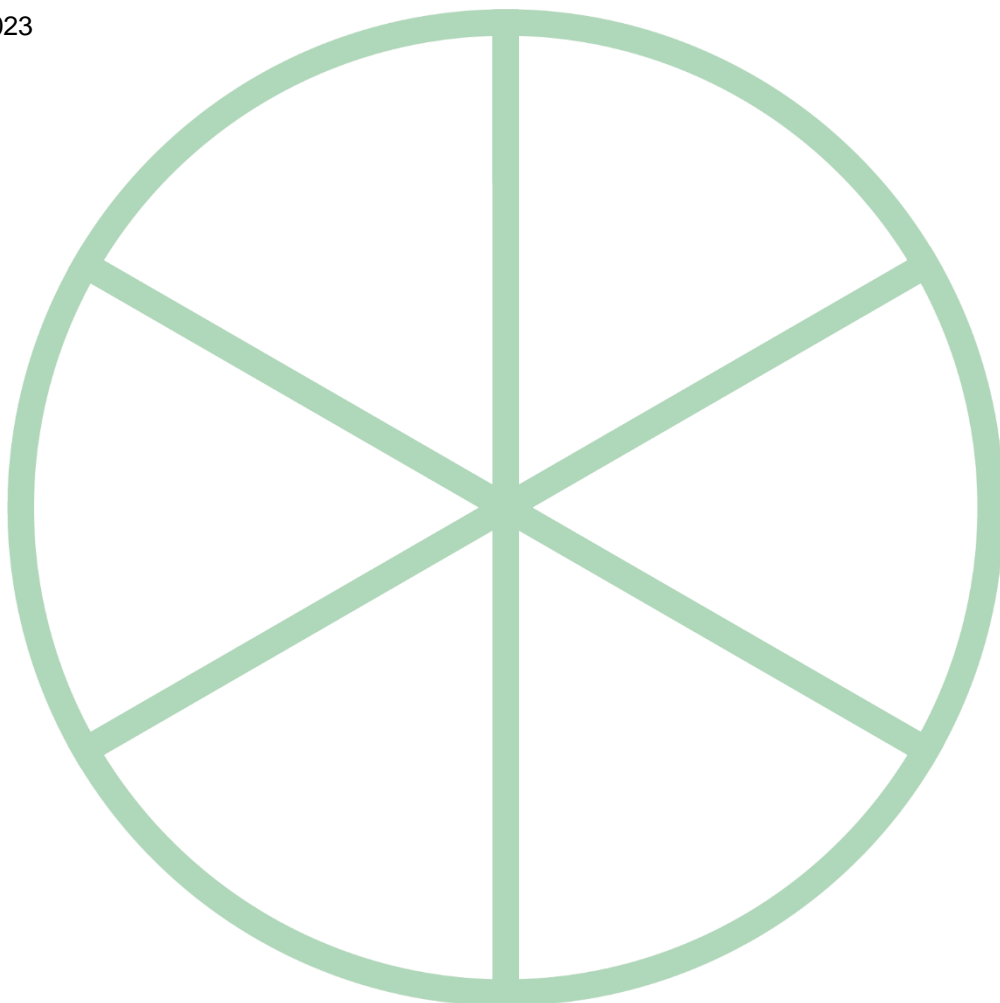

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Algemene ontwikkelingen	8
3	Ondernemen en Innoveren: Gezond Ondernemen	15
4	Vitaal en Gezond: Gezond zijn en blijven.....	30
5	Toerisme en Leisure: Gezond Leven	44
6	Landelijk Gebied: Gezonde Leefomgeving	54
7	Mobiliteit en Logistiek: Gezond Verbinden	66
8	Energie en Klimaat: Gezond Leefklimaat	78


1



Inleiding

1.1 Achtergrond

De acht gemeenten in Noord-Limburg werken samen met het Rijk, de Provincie Limburg, bedrijven en maatschappelijke partners aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Hiervoor is de Regiovisie 2040 opgesteld, waarin de acht Noord-Limburgse gemeenten beschrijven hoe zij kunnen samenwerken om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Om dit te bereiken, zijn de juiste instrumenten nodig. Tussen het Rijk, de Provincie en de Regio is hiervoor een Regio Deal gesloten en tussen de Provincie en de Regio is een Investeringsagenda opgesteld. Vanuit de Regio Deal en Investeringsagenda wordt een groot aantal activiteiten en projecten uitgevoerd. Onderdeel van de Regio Deal en de Investeringsagenda is de afspraak om de voortgang ervan te monitoren. De voortgangsrapportage over 2022 beschrijft de voortgang van alle programma's en projecten die onder de Investeringsagenda en de Regio Deal vallen.

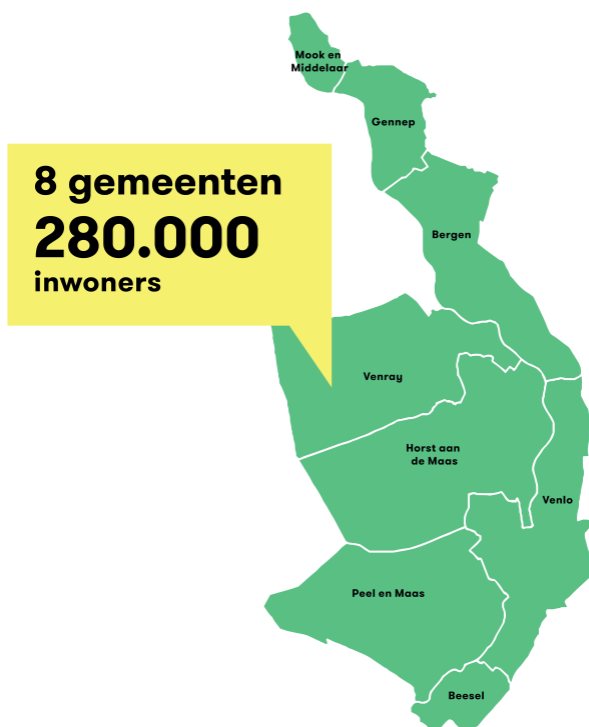

Noord-Limburg

De Regio Noord-Limburg bestaat uit acht Noord-Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray. In de regio wonen circa 280.000 mensen. De regio grenst voor een groot deel aan de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Deze internationale context is (mede) bepalend voor de kansen en opgaven in de regio. Binnen een straal van 100 km rondom Noord-Limburg wonen 15,6 miljoen mensen. De Regio Noord-Limburg ligt geografisch gezien op het kruispunt van de economisch georiënteerde oost-westas (Rotterdam - Ruhrgebied) en de kwalitatief landschappelijk-recreatief en sociaal georiënteerde noord-zuidas (Maas - Beesel tot Mook en Middelaar).


Opbouw samenwerking

De samenwerking in de Regio Noord-Limburg uit de Regiovisie 2040 is verder uitgewerkt in Uitvoeringsprogramma's die elke vier jaar worden herzien. Momenteel is dit het Uitvoeringsprogramma 'de Gezondste regio' 2020-2023. In dit uitvoeringsprogramma zijn projecten opgenomen waarmee de betrokken partijen werken aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-

Limburg. De projecten worden op verschillende wijzen gefinancierd. Deels gaat dat vanuit de gezamenlijke Investeringsagenda van de acht regiogemeenten en de Provincie Limburg. Voor andere projecten draagt het Rijk bij vanuit de Regio Deal. En tot slot ondernemen de gemeenten gezamenlijke activiteiten die buiten de Regio Deal en Investeringsagenda vallen.

Om het geheel te sturen, zijn er zes programma's opgezet, waarbinnen de verschillende projecten vallen. Onder de Regio Deal hangen vijf thema's en vanuit de Investeringsagenda wordt samengewerkt in zes programma's, met elk twee tot vijf programmalijnen. **Figuur 1** geeft een overzicht van de programma's en thema's, en de samenhang daartussen.


FIGUUR 1. DE ZES PROGRAMMA'S BINNEN DE GEZONDSTE REGIO, HUN PROGRAMMALIJNEN EN DE THEMA'S UIT DE REGIO DEAL

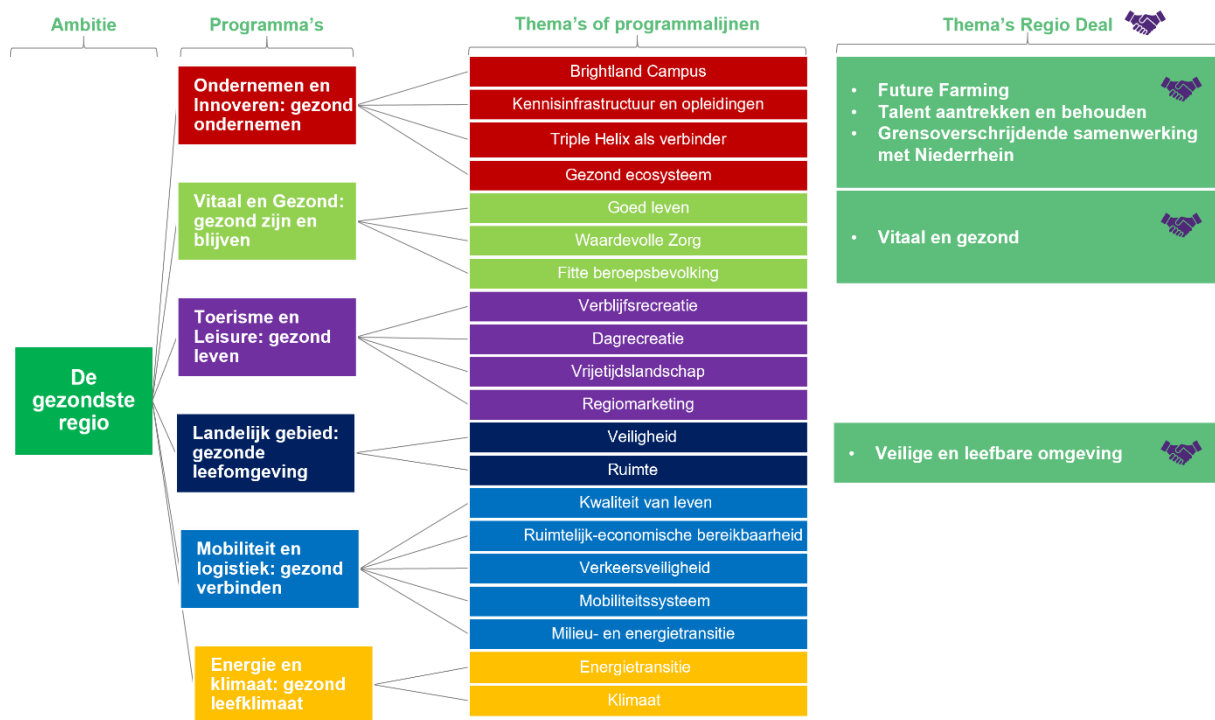

Werken aan de gezondste regio en brede welvaart

Met de zes programma's, vijf Regio Deal-thema's en de onderliggende projecten wil Noord-Limburg de Gezondste Regio van Nederland worden en zo de brede welvaart verbeteren. Gezondheid in deze context gaat niet alleen over fysieke gezondheid, maar ook over een gezond ondernemersklimaat, de mogelijkheid om te ontspannen, mobiel te blijven, duurzame energieopwekking en een prettige en klimaatbestendige leefomgeving. Met de programma's en projecten wil de regio dan ook – uiteindelijk - maatschappelijke impact realiseren. Voor een overzicht hiervan, wordt gebruik gemaakt van de cijfers van het CBS over "brede welvaart" (zie **Figuur 2**).

FIGUUR 2. BREDE WELVAART NOORD-LIMBURG, CBS-CIJFERS VOOR 2020 EN 2021

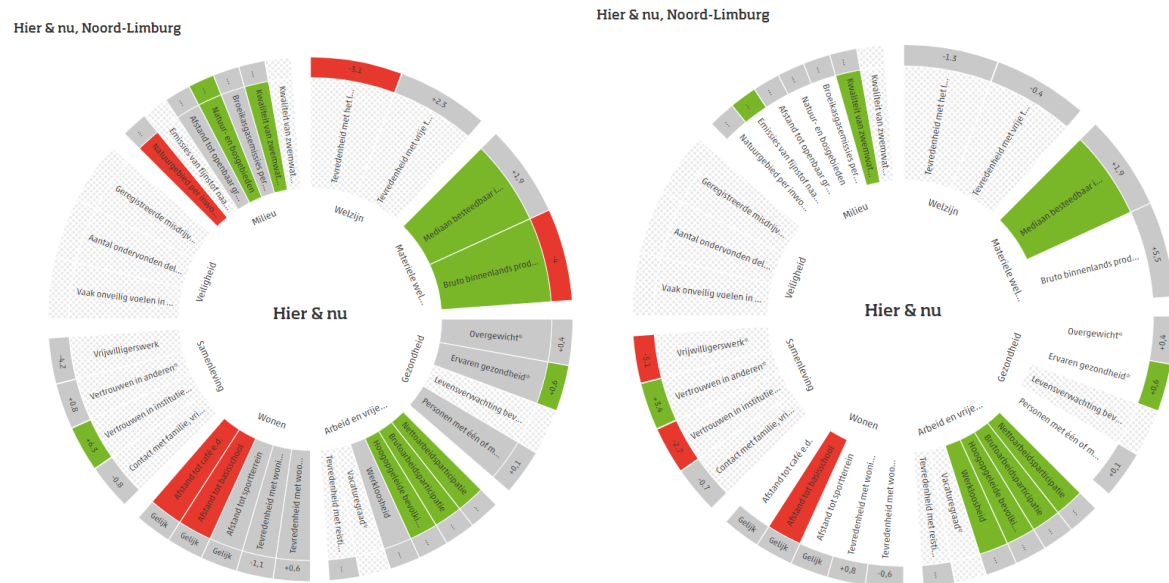


Het CBS duidt de ontwikkeling van de brede welvaart met cijfers over welzijn, materiele welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid, en milieu. De meeste recente CBS-cijfers over brede welvaart zijn voor 2021 (figuur 2, rechts). In 2020 jaar zijn de programma's onder de Gezondste Regio van start gegaan. We gebruiken de data voor 2020 (figuur 2, links) daarom als nulmeting. Belangrijk om te benoemen is dat bovenstaande data niet te gebruiken zij als correlatief of causaal verband tussen voortgang en de investeringen vanuit de Investeringsagenda en Regio Deal.

1.2 Voortgangsrapportage op basis van monitoringsplan

Deze voortgangsrapportage vloeit voort uit het monitoringsplan dat in 2021 is uitgewerkt en geagendeerd en besproken in het Rijks-Regio-overleg op 4 oktober 2021. De monitoring en daarmee deze rapportage is opgebouwd rondom de zes programma's, en de daaraan verwante Regio Deal-thema's, waarbinnen wordt gewerkt aan de Gezondste Regio. Ieder programma bestaat uit een aantal programmaliijnen met bijbehorende programmadoelen. De thema's uit de Regio Deal hebben een eigen positie binnen de programma's. Deze programmadoelen zijn geformuleerd als gewenste maatschappelijke effecten (*outcome*), waaraan de activiteiten van het programma (*output*) bij moeten dragen. Figuur 3 geeft dit schematisch weer. Voor elk programmadoel en elke activiteit zijn een of meerdere doelindicatoren beschreven aan de hand waarvan de voortgang wordt gemonitord.

FIGUUR 3. VAN INPUT NAAR IMPACT IN DE GEZONDSTE REGIO



Leeswijzer

De voortgangsrapportage is – zoals hiervoor beschreven – opgebouwd aan de hand van de zes programma's met daarbinnen, indien van toepassing, de Regio Deal thema's. Ieder programma wordt kort geïntroduceerd. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de relatie met de ontwikkeling van de brede welvaart, de voortgang op programmaniveau, de samenwerking en tot slot de voortgang van projecten. De voortgangsrapportage gaat in op het jaar 2022, waarbij soms ook relevante ontwikkelingen uit begin 2023 worden vermeld. Voor sommige projecten zijn al concrete resultaten te benoemen, terwijl andere projecten pas eind 2022 zijn beschikt of in 2023 starten. De status van projecten maken we dan ook expliciet in de overzichten met projecten. Tot slot bevat elk hoofdstuk een overzicht van de financiën, eerst overkoepelend (hoofdstuk 2) en vervolgens per programma (hoofdstukken 3 tot en met 8).

2



Algemene ontwikkelingen

2.1 Algemene voortgang

In 2022 liepen verschillende projecten uit de Investeringsagenda en Regio Deal door, zijn er nieuwe projecten begonnen en zijn de eerste projecten afgerond. De eerste tranche van de Regio Deal en eerste en tweede enveloppes van de Investeringsagenda zijn in uitvoering of worden afgerond. In 2022 zijn daarnaast projecten opgestart in de tweede tranche van de Regio Deal en de derde enveloppe van de Investeringsagenda. Het was dan ook een jaar waarin het succes en de uitdagingen van de programma's duidelijk te zien zijn. Over het algemeen zijn de programma's succesvol in het opzetten van projecten en halen zij de beoogde projectdoelen. De meeste vertraging zit nog steeds in late opstarten die te maken hebben met corona. In veel gevallen worden deze projecten inmiddels versneld opgestart. Omdat niet alle verloren tijd is in te halen zijn een aantal projecten verlengd.

Breder gezien heeft dit met name invloed op de samenwerking in de Regio Noord-Limburg. In een programma als Toerisme en Leisure waren al veel samenwerkingsovereenkomsten tussen verschillende gemeentes. De samenwerking binnen de Investeringsagenda is voor veel ambtenaren dan ook een voortzetting van eerdere samenwerking, maar met duidelijker vastgelegde doelen. De grootste impact is echter de geïntegreerde programmastructuur van De Gezondste Regio als geheel. Dit nodigt samenwerking tussen verschillende domeinen uit, die de gezamenlijke doelen behartigen om de Gezondste Regio te worden. Een voorbeeld hiervan is in het project Groene en Rode Vakantieparken, waarin het programma Toerisme en Leisure samenwerken met het thema Veiligheid – uit het programma Landelijk Gebied. Hierin wordt de problematiek rondom vakantieparken in kaart gebracht, het bewustzijn hiervan vergroot en oplossingen geïmplementeerd.

2.2 Ambtelijke en bestuurlijke samenwerking Rijk, Regio en Provincie

Om te komen tot een eerste termijn projectenlijst is vanaf het sluiten van de Regio Deal op 10 juli 2020, de afstemming en samenwerking op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau tussen de Provincie Limburg en Regio Noord-Limburg geïntensiveerd. De Regio Noord-Limburg heeft zich gericht – en richt zich nog steeds – op het samenstellen van een totaalpakket van projecten binnen de Regio Deal en de Investeringsagenda. Hierdoor kan elke gemeente zich herkennen in de totale investering en kan de besluitvorming over het beschikbaar stellen van benodigde gemeentelijke middelen bij alle gemeenten goed onderbouwd worden.

Er is tussen de Regio Noord-Limburg en de Provincie gewerkt aan wederzijds begrip en afstemming over elkaars belangen, ook in relatie tot de verantwoording binnen de provinciale en gemeentelijke beleidskaders waar de benodigde cofinanciering uit gedekt wordt. Er was veel tijd nodig om voor de bredere context in gezamenlijke afstemming te zoeken naar meer integrale benaderingen, kansen voor opschaling en koppelkansen met lopende projecten en gereserveerde middelen.

De projecten binnen de Regio Deal-thema's en Investeringsagenda-programmalijnen vragen nog steeds veel interne afstemming tussen de vele verschillende betrokken provinciale en gemeentelijke organisatieonderdelen en met de betrokken initiatiefnemers. Daarnaast moesten ook de bestuurders elkaar op inhoud en bestuurlijke/strategische context zien te vinden. Dit alles was een proces van leren(d) samenwerken dat moest plaatsvinden tijdens de coronapandemie.

Het heeft dan ook relatief veel tijd gekost om te komen tot de definitieve bestuurlijke besluitvorming rondom de eerste termijn/enveloppe van projecten. In februari 2021 hebben alle negen Colleges van GS en B&W hun akkoord gegeven op de project uit de eerste Regio Deal-termijn en Investeringsagenda-enveloppe. Vanaf dat moment kon gestart worden met het verlenen van de subsidieaanvragen in de eerste termijn. Een vertragende factor hierbij was de provinciale bestuurscrisis; na het opstappen van het provinciale bestuur op 9 april 2021 was gedurende drie maanden geen bestuurlijke afstemming mogelijk. Vanaf begin mei 2021 zijn toch de subsidiebeschikkingen van projecten uit de eerste termijn Regio Deal verleend en konden initiatiefnemers daadwerkelijk starten met de uitvoering. Na het vaststellen van de Uitvoeringsovereenkomst voor de Investeringsagenda op 30 november 2021 kon ook de subsidieverlening voor de projecten binnen de Investeringsagenda starten.

2.3 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per programma, voor de tweede termijn Regio Deal en eerste en tweede enveloppe Investeringsagenda.

Regio Deal

Eerste termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
	€ 19.417.251	€ 9.518.626	€ 9.898.626
Thema 1 - Future Farming			
Subtotaal 1	€ 10.200.000	€ 5.100.000	€ 5.100.000
Thema 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ 4.570.000	€ 2.095.000	€ 2.475.000
Thema 3 - Talent			
Subtotaal 3	€ 3.376.885	€ 1.688.443	€ 1.688.443
Thema 4 - Veiligheid			
Subtotaal 4	€ 1.080.000	€ 540.000	€ 540.000
Thema 5 - Grensoverschrijdende samenwerking Niederrhein			
Subtotaal 5	€ 190.366	€ 95.183	€ 95.183

Tweede termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
	€ 17.113.107	€ 7.981.374	€ 9.131.734
Thema 1 - Future Farming			
Subtotaal 1	€ 8.300.000	€ 4.150.000	€ 4.150.000
Thema 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ 2.986.568	€ 900.000	€ 2.086.568
Thema 3 - Talent			
Subtotaal 3	€ 2.026.107	€ 1.013.054	€ 1.013.054
Thema 4 - Veiligheid			
Subtotaal 4	€ 1.533.000	€ 766.500	€ 766.500
Thema 5 - Grensoverschrijdende samenwerking Niederrhein			
Subtotaal 5	€ 1.978.126	€ 1.012.514	€ 965.612
Procesmiddelen: voorbereiding, administratie en toezicht (VAT-kosten)			
Subtotaal 6	€ 289.306	€ 139.306	€ 150.000

Investeringsagenda

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 8.561.642	€ 4.277.349	€ 4.284.293
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ 1.397.000	€ 821.000	€ 576.000
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ 1.698.952	€ 721.500	€ 977.452

Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€	154.350	€ 76.475
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€	3.750.000	€ 1.875.000
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€	1.059.540	€ 536.574
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€	521.800	€ 256.800

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€	7.785.276	€ 3.754.126
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€	636.500	€ 318.250
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€	1.604.791	€ 746.549
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€	4.506.404	€ 2.210.504
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€	-	€ -
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€	277.646	€ 138.823
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€	777.935	€ 358.000

Derde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 1.050.000	€ 525.000	€ 525.000
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ -	€ -	€ -
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€ -	€ -	€ -
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€ -	€ -	€ -
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€ 900.000	€ 450.000	€ 450.000
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd door middel van in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenvelopes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

3



**Ondernemen
en innoveren**

Ondernemen en Innoveren: Gezond Ondernemen

3.1 Inleiding

Het programma Ondernemen en Innoveren richt zich op de ontwikkeling van Noord-Limburg tot een unieke en innovatieve regio binnen beeldbepalende economische sectoren. (Grensoverschrijdende) samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid is daarbij van belang, evenals het aantrekken van talent. De doorontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo is een toonaangevend project. De campus wordt komende jaren verder ontwikkeld en wordt uitgebreid met het Brightlands Future Farming Institute (BFFI).


In **Figuur 4** zijn de verschillende programmalijnen en -doelen uitgebeeld die het programma Ondernemen en Innoveren adresseert. De achttien programmadoelen vallen onder vier programmalijnen, die verschillende onderdelen van gezond ondernemen proberen te stimuleren. Dit zijn de “Doorontwikkeling Brightlands campus”, “Doorontwikkeling kennisinfrastructuur en opleidingen en aantrekken en binden van talent”, “Triple helix als verbinder” en “Gezond ecosysteem”. Hiermee stimuleert de regionale samenwerking, goede opleidingen, uitdagende banen en een prettige omgeving om in te wonen en in te werken.

Regio Deal

Binnen het programma Ondernemen en Innoveren wordt zowel vanuit de Investeringsagenda als de Regio Deal samengewerkt. Specifiek vallen hieronder de volgende Regio Deal-thema's:

- 1) Future Farming
- 2) Talent aantrekken en behouden
- 3) Grensoverschrijdende samenwerking met Niederrhein

FIGUUR 4. PROGRAMMALIJNEN EN -DOELEN BINNEN ONDERNEMEN EN INNOVEREN

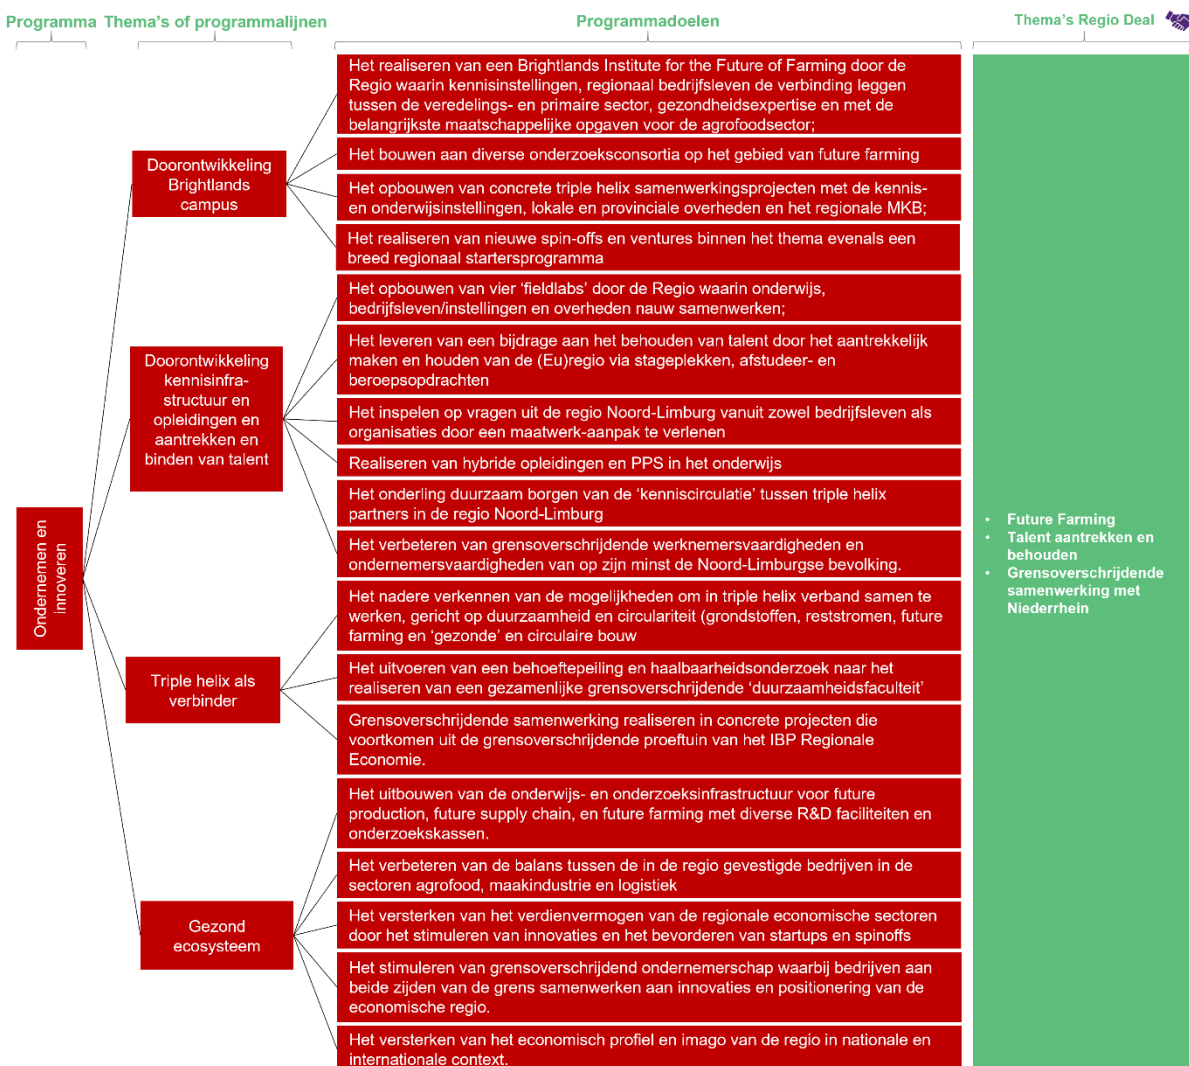

3.2 Ontwikkeling brede welvaart

Met behulp van de CBS-statistieken op het gebied van 'brede welvaart' geven wij een overzicht van hoe op dit moment in de regio gaat. Deze statistieken geven ook aan hoe de regio het doet ten opzichte van andere COROP-regio's. **Figuur 5** toont de cijfers op het gebied van materiële welvaart, en arbeid en vrije tijd.

FIGUUR 5. CBS BREDE WELVAART DATA ONDERNEMEN EN INNOVEREN



N.B. De nummering geeft de positie aan van de Regio Noord-Limburg ten opzichte van andere COROP-regio's. Deze brede-welvaartindicatoren geven veranderingen in de statistieken weer. Dit vraagt om een zorgvuldige interpretatie, immers het aantonen van causaliteit (oorzaak en gevolg) en eventuele correlatie (statistische samenhang) vereist nader onderzoek.

3.3 Voortgang programma

Het programma Ondernemen en Innoveren is opgemaakt uit vijf nu lopende projecten in de eerste en tweede tranche van de Regio Deal en zes in de eerste en tweede enveloppe van de Investeringsagenda. Er is momenteel één project in de derde enveloppe die wacht op een beschikking. Daarnaast vallen er enkele projecten onder het programmateam van Ondernemen en Innoveren, die buiten de Regio Deal en Investeringsagenda om gefinancierd worden.

De voortgang op deze projecten gaat gestaag, al zitten veel projecten nog in een opstartfase. Omdat het hierbij gaat om innovatieprojecten, betekent dat ook dat niet alles volgens een vast plan verloopt. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en markten en dat leidt soms tot andere uitkomsten dan op voorhand bedacht. Het betrekken van kennisinstellingen en studenten is een belangrijk onderdeel van veel van de projecten, die vaak gericht zijn op onderzoeken met een praktische component. Bovendien wordt veel samengewerkt met bedrijven. Samen zorgt dit er vaak voor dat er tegelijkertijd een maatschappelijk doel wordt bereikt en de innovatie voor het bedrijf de omzet of winst kan verhogen.

3.4 Samenwerking en proces

Anders dan veel andere programma's wordt het grootste deel van de projecten binnen Ondernemen en Innoveren geïnitieerd vanuit de markt, niet de overheid. Innovatie wordt in dit programma bewerkstelligd door een ondernemer die een kans ziet en dit samen met kennisinstellingen en de overheid wilt ontwikkelen. De omgeving – van omwonenden en burgers – speelt ook een belangrijke rol in het legitimeren van dit proces. In dit programma wordt dit type samenwerking gezien als de triple (overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen) of quattro helix (triple helix en omgeving).

De uitdaging in deze triple of quattro helix samenwerking is dat elke partij net iets anders naar een project kijkt en de belangen kunnen verschillen. Hier moet dus een partij tussen zitten die het project coördineert en aanstuurt op meerwaarde voor alle betrokken partijen. In 2022 werd die rol door zowel Crossroads als het programma Ondernemen en Innoveren genomen en soms ook door individuele gemeenten. Er wordt bezien hoe en door welke partij die rol voor de toekomst optimaal kan worden ingevuld.

3.5 Voortgang en ontwikkelingen per project

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Termijn/ Enveloppe	Beschikt?	Status/ Looptijd	Voortgang
RD1 Brightlands Future Farming Institute (BFFI)	Bijdragen aan de technologische en maatschappelijke uitdagingen in de <i>agrifood</i> sector middels onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Dit gebeurt door enkele faciliteiten te realiseren, zoals een R&D-kas.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/11/20 - 01/01/24	<ul style="list-style-type: none"> De ontwikkeling van de infrastructuur ligt op koers. Het ontwerp voor de kas is in januari 2022 definitief gemaakt, waarna een aanbestedingsprocedure is begonnen. Door geringe inschrijving zijn de gunningen onderhands uitgezet. Inmiddels zijn tien van de elf percelen gegund. De ontwikkeling van het BFFI is daarnaast onderweg door de werving en selectie van enkele stafleden. De werving van een hoogleraar is nog niet geslaagd, maar dit wordt begin Q2 van 2023 verwacht. Daarnaast zet de Universiteit Maastricht een bachelor <i>Sustainable Bioscience</i> op en een master <i>Crop Biotechnology and Engineering</i> samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.
RD6-9 Fieldlabs	De totstandkoming van vijf operationele Fieldlabs: 1. Future Farming (FF), 2. Voeding en Gezondheid (V&G), 3. Technological Innovation and Smart Logistics (TISL), 4. Grensoverschrijdend Ondernemen, 'Grenslab', 5. Circulaire Transitie (CiTr)	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/09/20 – 31/12/23	<ul style="list-style-type: none"> In september 2021 zijn de eerste vier fieldlabs van start gegaan, in januari 2022 ging ook CiTr van start. Op deelgebieden hebben tot en met de zomer van 2021 voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, vanaf september 2021 zijn diverse projecten opgestart. De fieldlabs opereren grotendeels naar verwachting. Zij slagen erin om de verbinding te leggen met de beroepspraktijk. Zo bieden betrokken bedrijven een groot aantal afstudeer-, stage- en beroepsopdrachten in de Euregio aan. Al 299 MKB-bedrijven zijn betrokken bij gezamenlijke fieldlabs. Er is ook enige vertraging in de fieldlabs. Het doel om één loket te realiseren waar bedrijven met hun vraagstukken en opdracht terecht kunnen, is nog niet gelukt. Tot eind 2022 was de Crossroads organisatie nog niet helemaal operationeel. Ook fieldlab TISL kampt met vertraging, in dit geval door vervanging van de projectleider.

RD18 Samen werken aan duurzaamheid en circulariteit (incl. IBP en Grenscollege)	Om jonge mensen aan te trekken en te behouden in de (Eu)regio, onderneemt Gilde Opleidingen verschillende activiteiten met partners in de Euregio. Eén van deze activiteiten is het initiatief "Gilde International" (in het projectplan vernoemd als "Gilde Grenscollege"). Gilde International biedt jongeren de mogelijkheid om zich binnen 4 uitstroomrichtingen voor te bereiden op werken en leren in de euregio.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/09/20 - 01/09/21	Er zijn inmiddels 31 studenten die onderwijs volgen aan het grenscollege Gilde International. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd om het opleidingsinstituut te versterken, waaronder training van medewerkers, bredere samenwerking en marktonderzoek.
RD20 BCGV: Kas t.b.v. shared facilities		Regio Deal termijn 2	Aanvraag in voorbereiding		
RD21 Poultry Research Center		Regio Deal termijn 2	Aanvraag in voorbereiding		
RD22 BCGV: Doorontwikkeling Test- en tastecentrum		Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/12/22 – 31/12/25	Het project is in 2022 beschikt en heeft nog geen voortgangsrapportage hoeven aan te leveren. Voortgang over 2022 wordt pas later in 2023 aangeleverd.
RD23 BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant		Regio Deal termijn 2	Aanvraag in voorbereiding		
RD24 BCGV: Facilites		Regio Deal termijn 2	Deels beschikt	01/01/23 – 01/01/25	Het project is in 2022 beschikt en heeft nog geen voortgangsrapportage hoeven aan te leveren. Voortgang over 2022 wordt pas later in 2023 aangeleverd.
RD26 Regio in je Rugzak		Regio Deal termijn 2	Aanvraag in voorbereiding		
RD27 Meet The Youngsters Noord Limburg	Jongeren, studenten en young professionals laten zien welke mooie bedrijven en kansen er in Noord Limburg zijn, door:	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/04/22 – 31/12/23	<ul style="list-style-type: none"> Het project is op 24 juni 2022 beschikt. Na de zomer zijn direct bedrijven benaderd, waarvan er 10 hebben toegezegd, 25 in afwachting zijn en 12 het aanbod hebben afgewezen.

	<ul style="list-style-type: none"> - Het uitrollen van het platform Meet the Youngsters in Noord Limburg, waarop minimaal 100 Noord-Limburgse bedrijven worden aangesloten, met per bedrijf minimaal 150 leerlingen/studenten in het netwerk van dat bedrijf - Het betrekken van minimaal 14 Noord-Limburgse bedrijven bij activiteiten met studenten, door bijvoorbeeld de organisatie van 4 Tour de Limburg (met in totaal bezoek aan 8 bedrijven), 6 College Tours (met participatie van 6 bedrijven) of speeddates in het geval de Tours niet mogelijk zijn. - Het organiseren van minimaal 5 serious game activiteiten en gastlessen, die door minimaal 375 leerlingen zijn gevolgd 				<ul style="list-style-type: none"> • Daarnaast zijn er vijf activiteiten georganiseerd; een gastcollege met inzet van <i>Virtual Reality</i>, twee <i>College Tours</i> en twee <i>Escape Rooms</i> <p>Door een late beschikking, wordt uitstel gevraagd tot 1 juni 2024. Hierdoor blijft de projectduur 24 maanden.</p>
RD28 Traineeprogramma Noord-Limburg			Beschikt	Lopend 01/09/22 - 31/12/25	Het project is in 2022 beschikt en heeft nog geen voortgangsrapportage hoeven aan te leveren. Voortgang over 2022 wordt pas later in 2023 aangeleverd.
RD29 Fieldlab Circular Innovation			Beschikt	Lopend 01/09/22 - 31/12/25	Het project is in 2022 beschikt en heeft nog geen voortgangsrapportage hoeven aan te leveren. Voortgang over 2022 wordt pas later in 2023 aangeleverd.
RD36 Gilde International	Gilde International biedt jongeren de mogelijkheid om zich binnen 4 uitstroomrichtingen voor te bereiden op werken en leren in de euregio. Dat wil zeggen dat er naast de vakinhoud heel veel aandacht is voor de taal en (bedrijfs-)cultuur uit de euregio	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/09/21 - 31/08/24	<ul style="list-style-type: none"> • In het eerste jaar – 2021/2022 – zijn 15 studenten begonnen, in het tweede – 2022/2023 – 24. Van het eerste jaar zijn er 7 over, waardoor er nu in totaal 31 studenten aan het programma deelnemen. Er wordt daarnaast samengewerkt met enkele scholen uit de Duitse regio's.

RD37 Euregional Sustainability Center	Het doel is om twee – samenhangende en verbonden – operationele living labs op te richten waarin partners uit bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek (huidig en toekomstig) talent voorbereiden op een toekomst in het regionale (MKB) bedrijfsleven.	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/09/22 – 31/08/24	Omdat de periode van september 2022 tot april 2023 de kwartiermakersfase betreft, zijn er nog geen grote aantallen studenten bereikt en of onderzoeksvragen van bedrijven kunnen aanpakken. Tijdens deze fase ging het vooral om het binden en committeren van partners, het organiseren van hun inzet en het opzetten van de governance en communicatiestrategie. Op deze punten zijn grote stappen gezet en is het project klaar voor de volgende fase. Daarnaast is er al enige voortgang op de KPI's. Zo zijn er al twee R&D-praktijkprojecten in uitvoering en zijn er al 7 (van de beoogde 200) studenten betrokken bij onderzoek.
RD38 Euregio Toolkit - Regio Rijn-Maas Noord en Euregio Rijn-Waal		Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 – 31/12/23	Het project is in 2022 beschikt en heeft nog geen voortgangsrapportage hoeven aan te leveren. Voortgang over 2022 wordt pas later in 2023 aangeleverd.
RD39 Triple Helix/Quatro helix		Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 – 31/12/23	Het project is in 2022 beschikt en heeft nog geen voortgangsrapportage hoeven aan te leveren. Voortgang over 2022 wordt pas later in 2023 aangeleverd.
IA001 Bacheloropleiding Gezondheid	Een actieve vierjarige bacheloropleiding Gezondheid. Tien netwerkpartners met leerwerkplek.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/09/21 – 28/02/23	In september is de bacheloropleiding Gezondheid gestart met een tweede cohort studenten. Het docententeam in Venlo is uitgebreid om zo ontbrekende expertise binnen te halen om het curriculum nog beter in elkaar te zetten. De werving voor het komende jaar loopt en hier zijn veel extra activiteiten in ondernomen om zichtbaar te zijn voor potentiële studenten. Naast voltijd studenten zullen wij in september 2023 starten met een deeltijd variant van de opleiding. Er zijn zes leerwerkplekken gerealiseerd bij regionale partners: drie zorginstellingen, één scholengemeenschap, één bij de gemeente en één koepelorganisatie.
IA002 LINT	Een structureel onderzoeksprogramma op het gebied van agro-technologie: - minimaal 15 keukentafelgesprekken met	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/09/22 – 31/12/25	Om het overkoepelende doel van een structureel onderzoeksprogramma te halen, zijn een vijftal subdoelen geformuleerd. Hieraan wordt hard gewerkt en er is al de nodige voortgang behaald. Er hebben al tien keukentafelgesprekken plaatsgevonden met verschillende bedrijven. Die gesprekken worden nu

	roadmaps voor onderzoeksopzet - minimaal 6 gestarte onderzoeksprojecten - een onderzoeksprogramma van minimaal 5 jaar - opleveren van een plan voor de inrichting van een gezamenlijk lab in de Brightlands Campus - haalbaarheidsonderzoek en inrichtingsplan voor meerjarig lectoraat binnen het domein agrotechnologie				uitgewerkt tot mogelijke onderzoeksprojecten. Uit deze gesprekken zijn inmiddels al twee projecten opgestart: het ontwerpen van een appelplukrobot en het ontwikkelen van een AI die de schimmelziekte Mycophaeerella bij komkommers kan herkennen. Een breder onderzoeksprogramma volgt vervolgens als doel 1 is afgerond. Inmiddels hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden met Brightland Campus om een lab in te richten. Hier is verder nog geen voortgang op. Ook op het inrichten van een lectoraat bij instellingen is nog geen voortgang. Deze hangt af van een regeling die nog gepubliceerd moet worden.
IA003 Data Science & AI Academy	Vijftien workshops en kennisdeling-evenementen. 250 deelnemers uit bedrijfsleven en onderwijs. Veertig ondersteunende MKB'ers in business development.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/09/21 – 01/09/24	Vanuit diverse bedrijven en organisaties worden medewerkers afgevaardigd voor dit project. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om hun competenties om met data en AI te werken te vergroten. Dit geeft de verschillende organisaties een impuls om samen te werken en crossovers te zien die ze anders niet hadden aangegrepen. Daarnaast zorgt het project ervoor dat bepaalde data nu gebruikt (kan) worden, waar vooraf overheen gekeken werd.
IA004 Blue Plasma Centre	Het realiseren van een onderzoekslaboratorium, als onderdeel van het beoogde Plasma Center op de Brightlands Campus Greenport Venlo en het uitvoeren van experimenteel onderzoek in twee innovatietrajecten.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/22 – 31/12/24	Dit project loopt op alle afgesproken zaken uit de beschikking voor op schema. Zo is er preliminair onderzoek uitgevoerd naar de te gebruiken apparatuur en is er een testlaboratorium ingericht waar onderzoek kan worden gedaan naar de twee innovatieprojecten. Hiervan loopt er al één en bleek een ander (met name door regelgeving) toch niet haalbaar.
IA084 Brightlands Institute for Suply Chain Innovation (BISCI)	Een (inter)nationaal bekend kenniscentrum zijn op het gebied van duurzame, technologische en maatschappelijke keteninnovaties, door relevant praktijkonderzoek uit te voeren en kennis toe te passen in de praktijk.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/04/22 – 31/12/25	Het programma is enigszins aangepast, door het onderzoek meer te richten op wat bedrijven nodig hebben. Dit wordt bijvoorbeeld geïmplementeerd door studenten onderzoeksstages te laten lopen bij bedrijven en onderzoek te doen naar supply chain risico's. Daarnaast worden er ook supply chain tools ontwikkeld, zoals het 'blank sailing dashboard'. Hierin wordt met openbare data inzichtelijk

					gemaakt hoe zeegoederenvervoer verloopt en of er bijvoorbeeld havens worden overgeslagen.
IA087 Pilot circulaire ambachten	De pilot is gericht op het leveren van een substantiële bijdrage in de reductie van CO ₂ en bewoners en studenten bewust te maken van de noodzaak van circulair gebruik van grondstoffen.	Investeringsagenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 – 01/01/24	De voortgang is beperkt, met name door uitdagingen in de samenwerking. In de uitvoering is in Beesel een top-down aanpak en in Venlo een bottom-up aanpak gebruikt. De top-down autoriteit lijkt hierbij nodig te zijn om tot goede afspraken te komen. Enkele concrete resultaten zijn 30 ton vermeden grofvuil in Beesel, 12 betrokken vrijwilligers bij een repair café en 8 organisaties die betrokken zijn bij het circulaire gedachtegoed.

3.6 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor de eerste en tweede termijn Regio Deal en eerste en tweede enveloppe Investeringsagenda.

Regio Deal

Eerste termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 1 - Future Farming			
Brightlands Institute for the Future of Farming	€ 10.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Businessplan en voorbereiden consortia shared facilities	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Subtotaal thema 1	€ 10.200.000	€ 5.100.000	€ 5.100.000
Thema 3 - Talent			
Fieldlab Future Farming	€ 975.525	€ 487.763	€ 487.763
Fieldlab Voeding en Gezondheid	€ 881.520	€ 440.760	€ 440.760
Fieldlab Technological innovation & smart logistics	€ 839.100	€ 419.550	€ 419.550
Fieldlab Grensoverschrijdend ondernemen	€ 680.740	€ 340.370	€ 340.370

Subtotaal thema 3	€ 3.376.885	€ 1.688.443	€ 1.688.443
Thema 5 - Grensoverschrijdende samenwerking Niederrhein			
Samen werken aan duurzaamheid en circulariteit (incl. IBP en Grenscollege)	€ 190.366	€ 95.183	€ 95.183
Subtotaal thema 5	€ 190.366	€ 95.183	€ 95.183

Tweede termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio
Thema 1 - Future Farming			
BCGV: Kas t.b.v. shared facilities	€ 2.500.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000
Poultry Research Center	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 500.000
BCGV: Doorontwikkeling Test- en tastecentrum	€ 1.250.000	€ 625.000	€ 625.000
BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant	€ 350.000	€ 175.000	€ 175.000
BCGV: Facilites: R&D productontwikkeling, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering	€ 3.200.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000
Subtotaal thema 1	€ 8.300.000	€ 4.150.000	€ 4.150.000
Thema 3 - Talent			
Regio in de Rugzak	€ 416.150	€ 208.075	€ 208.075
Platform 'Meet Noord-Limburg'	€ 259.957	€ 129.979	€ 129.979
Regionaal Traineeprogramma	€ 400.000	€ 200.000	€ 200.000
Fieldlab Circulaire Transitie	€ 950.000	€ 475.000	€ 475.000

Subtotaal thema 3	€ 2.026.107	€ 1.013.054	€ 1.013.054
Thema 5 - Grensoverschrijdende samenwerking Niederrhein			
Gilde Grenscollege 2e fase	€ 312.350	€ 156.175	€ 156.175
Grensoverschrijdend Kennisinstituut voor duurzaamheid en circulariteit	€ 450.000	€ 225.000	€ 225.000
Euregio Toolkit	€ 265.776	€ 156.339	€ 109.437
Crossroads - Triple Helix	€ 950.000	€ 475.000	€ 475.000
Subtotaal thema 5	€ 1.978.126	€ 1.012.514	€ 965.612

Investeringsagenda

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Bacheloropleiding Gezondheid	€ 96.000	€ 48.000	€ 48.000
Brightlands Data Science & AI Academy Venlo	€ 225.000	€ 112.500	€ 112.500
Plasma Centre	€ 311.000	€ 155.500	€ 155.500
Plasma Centre aanvulling	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000
Bright5	€ 545.000	€ 395.000	€ 150.000
L.INT	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Subtotaal programma 1	€ 1.397.000	€ 821.000	€ 576.000


Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
BISCI	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Pilot Circulaire Ambachten	€ 436.500	€ 218.250	€ 218.250
Subtotaal programma 1	€ 636.500	€ 318.250	€ 318.250

Derde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget derde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Verbonden peelpoelproeftuinen	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000
Subtotaal programma 1	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

4

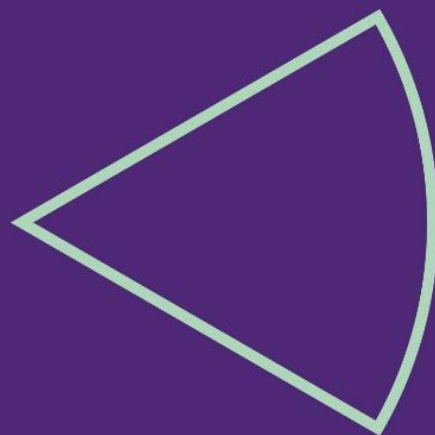

Vitaal en
gezond

Vitaal en Gezond: Gezond zijn en blijven


4.1 Inleiding

Het programma Vitaal en Gezond bestaat uit drie programmalijnen: Goed Leven, Waardevolle Zorg en Fitte Beroepsbevolking. In een leer-ontwikkel-netwerk leren de betrokken inwoners, gemeenschappen, ondernemers en beroepskrachten elkaar kennen, en wisselen zij ervaringen en expertises uit. Op deze wijze wordt in relaties geïnvesteerd en ontstaat er een netwerksamenwerking tussen mensen. Met het programma Vitaal en Gezond wordt gewerkt aan een regio waarin het vanzelfsprekend is dat we samen zorgen voor elkaar, en waar iedereen van jong tot oud naar eigen vermogen mee kan doen.

Regio Deal

Binnen het programma Vitaal en Gezond wordt zowel vanuit de Investeringsagenda als de Regio Deal samengewerkt. Het bijbehorende Regio Deal-thema heet eveneens “Vitaal en Gezond”.

FIGUUR 6. PROGRAMMALIJNEN EN DOELEN BINNEN VITAAL EN GEZOND

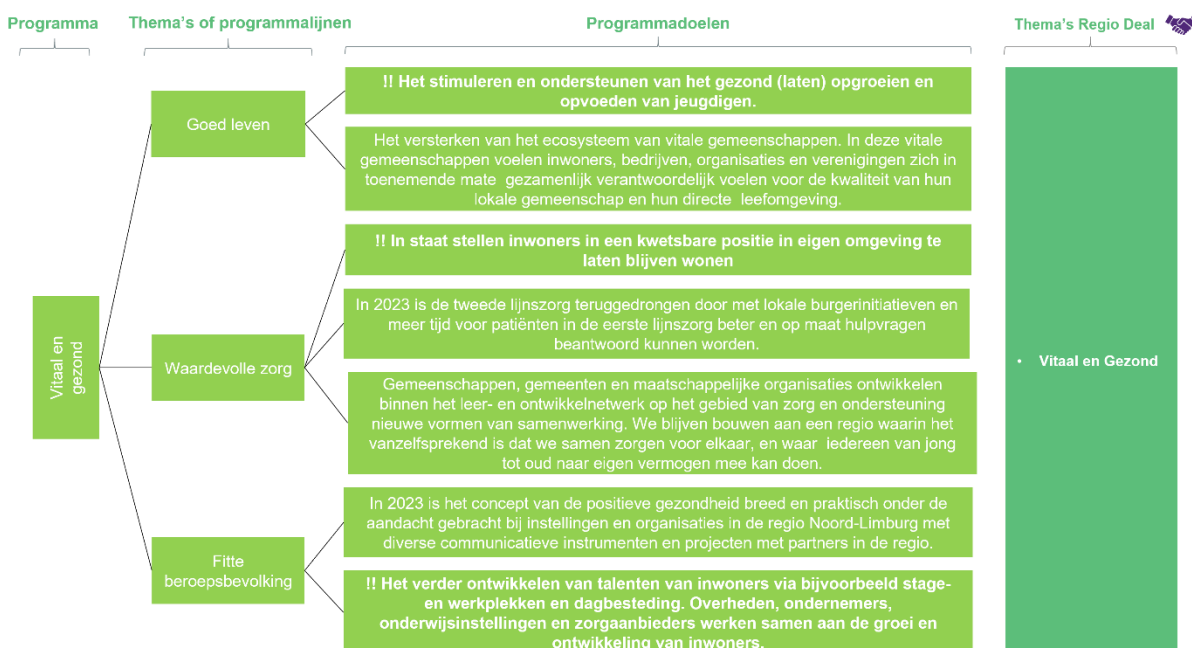

4.2 Ontwikkeling brede welvaart

FIGUUR 7. CBS BREDE WELVAART DATA VITAAL EN GEZOND

Gezondheid	
Overgewicht (2020) 52,5% 27^e van de 40	Ervaren gezondheid (2020) 76,8% 35^e van de 40
Levensverwachting bevolking (2019) 82,2 jaar 5^e van de 40	Personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (2020) 34,7% 33^e van de 40

N.B. De nummering geeft de positie aan van de Regio Noord-Limburg ten opzichte van andere COROP-regio's. Deze brede-welvaartindicatoren geven veranderingen in de statistieken weer. Dit vraagt om een zorgvuldige interpretatie, immers het aantonen van causaliteit (oorzaak en gevolg) en eventuele correlatie (statistische samenhang) vereist nader onderzoek.

4.3 Voortgang Programma

De voortgang in de verschillende projecten liep gestaag. Er zijn vanuit de Investeringsagenda dertien projecten in 2022 gestart, nadat deze in 2021 opgezet zijn. Daarnaast is er gewerkt aan de uitvoering van vier projecten binnen de Regio Deal. Drie daarvan waren in 2021 al wel in uitvoering. Over het algemeen liggen de projecten op koers, ondanks het feit dat sommigen verlaat van start zijn gegaan. Het traject voor leren, werken en ontwikkelen in Gennep, bijvoorbeeld, kreeg te maken met een late start, vertraging door corona en uitval van de projectleider. Desondanks loopt het project, qua kwantitatieve resultaten, voor op de planning in de beschikking. Er zijn in 2022 acht verschillende activiteiten en evenementen uitgevoerd, die een groot publiek hebben bereikt. Het project heeft wel uitstel uitgevraagd, om de tijd in te kunnen halen die het heeft gemist en om in het project de beoogde doelen te kunnen behalen.

4.4 Voortgang en ontwikkelingen per project

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Termijn/ Enveloppe	Beschikt?	Status/ Looptijd	Voortgang
IA007a - Leren, werken en ontwikkelen Peel en Maas	Dit project heeft als doel om jongeren, inclusief kwetsbare jongeren, NEET-jongeren en migranten, te ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Het project creëert alternatieve leeromgevingen en streeft naar triple helix ontwikkeling om leerwerkplekken te verduurzamen. Het project heeft ook twee kwalitatieve doelen: aansluiting bij het VSV-beleid en het aanmaken van een profiel binnen het platform Leo Loopbaan.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/07/21 - 01/01/24	<p>Er wordt binnen en buiten de regio samengewerkt en ervaringen uitgewisseld. Op basis van de eigen en aanvullende bevindingen transformeert het bestaande Activeringscentrum naar een Experience Centre (werknaam). Het Activeringscentrum voldeed – door het beperkte aanbod van activiteiten en sectoren- niet meer aan de vraag. Het Experience Centre (werknaam) is/wordt een fysieke plek waar participatie en inburgering gecombineerd worden. Een plek waar mensen kunnen werken aan (eigen)waarde en competenties. Ontmoeten- Oriënteren- Ontwikkelen en Ondernemen staan centraal.</p> <p>Kijkend naar de in de beschikking opgenomen kwantitatieve indicatoren ligt het project op schema. Dit is ondanks het feit dat het project vanwege de coronacrisis twee keer moest stoppen met activiteiten.</p> <p>Wat betreft de kwalitatieve resultaten wordt er aangesloten bij het beleid van VSV. Leo Loopbaan blijkt niet effectief, dus dit is niet ingevuld.</p>
IA007b - Leren, werken en ontwikkelen Venray	Het doel van dit project is dat deelnemers van het wijkleerbedrijf inwoners van de gemeente informele hulp bieden waar mantelzorgers en vrijwilligers niet aan toekomen. De kwantitatieve en kwalitatieve doelen zijn hetzelfde als beschreven bij IA007a.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/20 - 01/07/24	<p>In de periode van 2020 tot en met 2022 hebben jaarlijks gemiddeld 26 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel via hun praktijkstage informele hulp geleverd aan wijkbewoners in Venray. Deze praktijkstages werden gecombineerd met theoretisch onderwijs op de locatie Schuttersveld. Deelnemers volgen allen een opleiding tot assistent dienstverlener (entree-niveau) of een opleiding tot helpende zorg en welzijn (niveau 2).</p> <p>In de coronaperiode zijn er veel klanten afgehaakt, vanwege de coronamaatregelen en de angst om het virus op te lopen. In 2020 werd wekelijks aan 80 verschillende wijkbewoners ondersteuning geboden, eind 2022 waren dat er wekelijks 56. We zien nu weer een gestage groei in het aantal hulpvragen. Er zijn voldoende hulpvragen om de zittende deelnemers stage te kunnen laten lopen.</p>

IA007c - Leren, werken en ontwikkelen Genep	Het doel van dit project is een gecoördineerde aanpak voor ondersteuning van mobiliteit op de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig heeft, of het nu (her)intreders, carrièreswitchers of toetreders zijn. Kortom een eenduidige en laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt. De kwantitatieve en kwalitatieve doelen zijn hetzelfde als beschreven bij IA007a.	Investeringsagenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 01/01/24	<p>Voor dit project hebben in 2022 8 evenementen en activiteiten plaatsgevonden, waaronder het 'Frisse Blik Festival', de 'Werkervaringscarroussel', en 'Project Oekraïne'.</p> <p>Vanwege een late start, vertraging door corona en uitval van de projectleider heeft het project vertraging opgelopen. Om die reden vraagt het project een uitstel van de uitvoeringsdatum aan, van 31 december 2023 naar 30 juni 2025.</p> <p>Ondanks de vertraagde start zijn er zowel inhoudelijk als qua aantallen goede resultaten bereikt. Het aangevraagde uitstel is dan ook niet om in te lopen op de planning, maar om het werk dat momenteel wordt verzet af te sluiten en de doelen definitief te bereiken.</p>
IA010 – Zorgeloos wonen	Bewustwording vergroten onder burgers (doelgroep 40-60 jaar) over het tijdig investeren in thuishetchnologie. Hiermee meer eigen regie, positieve gezondheid, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse professionele en informele zorgverleners bereiken.	Investeringsagenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/09/22 - 31/12/23	Dit project is pas eind 2022 van start gegaan. De eerste plannen en voorbereidingen zijn daarna getroffen, maar het werk zal pas in 2023 echt van start gaan. Zo zijn er al gesprekken geweest met woningcorporaties en andere instanties en is er onderzocht of er gebruik gemaakt kan worden van bestaande projecten binnen de gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn wooncoaches of ouderenadviseurs.
IA011b - Cultuur op recept	Het doel van het project is zorgverleners, welzijnswerkers, bewonersondersteuners en leden van gemeentelijke Informatie en Adviesteams (I&A-	Investeringsagenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 22/03/22 - 31/12/23	Door enkele bijeenkomsten en stakeholdersoverleggen heeft het project een beeld weten te schetsen van de kansen, mogelijkheden, maar ook risico's van Cultuur op Recept (CoR). Hieruit bleek dat CoR op enkele punten overlapt met Welzijn op Recept (WoR), wat een breder programma inhoudt. De implementatie van WoR en het Nationale Zorgakkoord hebben grotere prioriteit, waardoor CoR hiermee goed moet afstemmen. Aangezien er in alle Noord-Limburgse gemeenten nu

	teams)/buurteams aan te moedigen om cultuur in te zetten als bijdrage aan een betere ervaren gezondheid van cliënten/patiënten. Lokaal wordt op maat de spilfunctie van cultuurcoach ontwikkeld samen met o.a. cultuuraanbieders, gemeenschappen en huisartsen.				welzijns- en cultuurcoaches actief zijn, kunnen zij vanaf 2023 meegenomen worden in de werkwijze van CoR.
IA013 - Transformatieplan Jeugd	Er zijn drie deelproducten: (1) Gelukkig Ouderschap, (2)1000 kansen, hechting en de eerste 1000 dagen en (3) Voorzorg. De beoogde resultaten zijn: (1a) 2 geschoolde professionals in de centering-methodiek, (1b) versterkt preventief en samenhangend aanbod voor (aanstaande) ouders, (1c) versterkte samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, (2a) 50 geschoolde professionals in IMH, (2b) uitbreiden van het netwerk rondom jonge kind en versterkte lokale samenwerking door structureel casuïstiekoverleg, (2c) mogelijkheid tot op- en afschalen binnen de	Investerings- agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 30/06/24	De doelen voor elk van de drie deelproducten zijn gehaald. Een deel daarvan heeft zelfs tot een hogere opbrengst geleid dan in de beschikking beoogd. Voor het deelproduct Gelukkig Ouderschap zijn er bijvoorbeeld in plaats van 2 geschoolde professionals in de centering methodiek in totaal 10 professionals opgeleid. Binnen het deelproduct 1000 kansen zijn er 60 professionals opgeleid in IMH in plaats van 50 en in Voorzorg zijn 19 trajecten opgestart in plaats van 15.

	(S)GGZ en voorliggende voorzieningen, (3a) opstart van 15 trajecten Voorzorg				
IA014a - Integrale wijkaanpak Horst	Het doel van het project is een aanpak ontwikkelen en uitvoeren voor het gezamenlijk oplossen van meerdere sociale vraagstukken in wijken waar van oorsprong veel sociale huurwoningen geclusterd zijn. Dit gebeurt door (1) het opstellen van een samenwerkingsagenda met inwoners en maatschappelijke partners, (2) het realiseren van quick wins in de wijken, (3) het realiseren van een kwaliteitsslag in zorg & welzijn in de drie wijken en (4) het doorontwikkelen van de integrale aanpak.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 01/01/24	Het project ligt op koers en een groot deel van de beoogde doelen zijn behaald. Zo is er in 2021 een samenwerkingsagenda opgesteld samen met de inwoners van de drie betrokken wijken. De inwoners hebben daarnaast ook extern fondsen geworven voor de uitvoering van de agenda. Vanuit de samenwerkingsagenda werken gemeente en inwoners samen aan verschillende initiatieven, vanuit enkele 'werkplaatsen' in de wijken zelf. Enkele projecten hierbinnen hebben wat vertraging opgelopen, maar een groot deel ervan loopt goed.
IA014b - Integrale wijkaanpak Venray	Het doel van het project is samen met bewoners en gebiedspartners op basis van een gebiedsanalyse, interviews en informatiebijeenkomsten een gedragen, integrale wijkaanpak voor (een deel van) Centrum-West in Venray formuleren. De tussenresultaten zijn (1)	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 01/01/24	De gebiedsagenda is geformuleerd en zowel inwoners als gebiedspartners staan hierachter. Door een onderzoek en bijeenkomsten te organiseren zijn de bewoners bij dit project betrokken en zijn er een aantal thema's geformuleerd waar de bewoners aan willen werken. De (gedeeltelijke) realisatie per thema is als volgt opgebouwd: Kleurrijke wijk: Na een proefveld van 25m ² in 2019 is er in 2021 een voedselbos van 3000m ² gerealiseerd. Daarnaast heeft ook de guerrilla-actie 'Bloembollen' plaatsgevonden, waarbij bollen door de wijk zijn geplaatst.

	het formuleren van een gebiedsagenda met inwoners en gebiedspartners en (2) het realiseren van de initiatieven genoemd in de gebiedsagenda.				<p>Jeugdige wijk: er zijn twee jonge vrijwilligers gevonden die voor 2023 een activiteitenplan voor jeugd en jongeren gaan opstellen en uitvoeren.</p> <p>Veilige wijk (verkeersveiligheid in de wijk): er is een werkgroep verkeer Noord-West opgesteld. Deze werkgroep gaat in 2023 onveilige punten in de buurt inventariseren en inwoners/weggebruikers bewust maken van 'goed' gedrag in het verkeer.</p> <p>Behulpzame wijk: hier zijn bankjes beschilderd zodat deze aantrekkelijker zijn om ontmoeting te stimuleren.</p>
IA046 - Regionaal servicepunt arbeidsmigranten	Het Servicepunt arbeidsmigranten regio Noord-Limburg richt zich op het informeren van arbeidsmigranten over zaken als huisvesting, inburgering en inschrijving in de gemeente. Het doel van dit project is om dit servicepunt te professionaliseren om zo: (1) een grotere doelgroep te bereiken en (2) toekomstbestendig te zijn.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 01/01/24	In 2022 is er een evaluatie uitgevoerd van het regionaal servicepunt. Hier zijn een aantal ontwikkelpunten voortgekomen die in de toekomst moeten worden aangepakt. Deze hebben zich gericht op de randvoorwaarden/ uitgangspunten die nodig zijn voor de doorontwikkeling en het uitwerken van de doorontwikkeling van het servicepunt. Deze doorontwikkeling blijkt vooral nodig te zijn op het gebied van: (1) een betere online positionering en (2) een verandering in de organisatie en de fysieke locatie van het servicepunt.
IA047 - Wijkaanpak Gennep	Het doel van het project is het verminderen van de (gezondheids)achterstand en bij de inwoners van de wijk en het versterken van het zelfsturend vermogen van de wijkbewoners. Het versterken van het organiserend vermogen van de wijk zelf via de wijkorganisatie(s). Dit gebeurt door een WijkLeerbedrijf in het buurthuis te realiseren.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 - 01/01/24	Per 1 april 2022 is er een nieuw bestuur van het wijkcentrum dat bestaat uit inwoners van Gennep-Zuid. Het buurthuis heeft het afgelopen jaar deze functie vervuld. Inwoners hebben elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. De wijkverbinder heeft op een laagdrempelige wijze contact gelegd met vele inwoners. Het wijkteam/ wijknetwerk moet nog wel verder worden vormgegeven.

IA048 - Preventieakkoord	Het doel is om roken, overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en eenzaamheid terug te dringen in Noord-Limburg	Investeringsagenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 30/11/21 - 31/12/23	<p>Er is onder andere samengewerkt met de Stichting Rookvrije Generatie. Zij hebben een uitvoeringsplan opgesteld, waar de werkgroepen Omgeving, Zorg en Rookvrije Start mee aan de slag kunnen. Dit heeft ertoe geleid dat gemeentegebouwen rookvrij zijn en er steeds meer signaleringsborden om dit in het openbaar tegen te gaan. Ditzelfde geldt voor meerdere sportaccomodaties en deelnemende zorginstellingen in de regio. Daarnaast wordt er binnen instellingen doorverwezen naar de mogelijkheden om te stoppen met roken. Specifieker is er een pilot opgezet om huisartsen met zwangere vrouwen in gesprek te laten gaan over het stoppen met roken.</p> <p>De voortgang op overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en eenzaamheid zijn per gemeente geregeld. Zo is in Beesel bijvoorbeeld een sportakkoord gesloten om overgewicht tegen te gaan en is het programma IN! Horst aan de Maas opgezet. Dit laatste programma is bedoeld om beschermende omgevingsfactoren te versterken waardoor het maken van gezonde keuzes een vanzelfsprekendheid wordt.</p>
IA088 - 10.000 talenplan	Bijdragen aan integratie en participatie van internationale werknemers in de Nederlandse samenleving en daarmee ook aan permanente vestiging van deze werknemers in onze regio.	Investeringsagenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/05/22 - 31/04/23 (wijziging: 01/10/22 - 31/12/23)	<p>In 2022 is een start gemaakt met het project door informatie op te halen en uit te wisselen met diverse stakeholders in de regio. Dit levert een beeld op van welke initiatieven er al zijn, waar een (mis)match zit en hoe de doelen uit de beschikking kunnen worden gehaald. De conclusies uit deze gesprekken zijn dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sociale integratie en taalafspraken bij vergunningsaanvragen worden meegenomen, • er aansluiting is bij het Regionaal Servicepunt en de MyInfoNL app, • er een bijeenkomst wordt georganiseerd met het Leer-/werkloket Noord-Limburg voor werkgevers en internationale werknemers uit de regio, om het belang van taal uit te dragen.
IA051 Vitaliteitscoöperatie America Left	Het doel is op doorgeleide van vragen van de inwoners van America, individueel en/of collectief, worden gewenste/ noodzakelijke interventies ingezet. Volgende vragen geven richting: 'wat wil ik', 'wat kan ik',	Investeringsagenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 30/11/21 - 31/12/22 (wordt verlengd)	<p>De dorpsondersteuner was al bezig met enkele informele ondersteuningsvragen, met dit project is dit verder uitgebreid. Er wordt inmiddels hulp geboden in het huishouden aan acht inwoners en twee inwoners worden individueel begeleid.</p> <p>Na aanvraag kan binnen twee weken een keukentafelgesprek plaatsvinden en na nog eens twee weken start de ondersteuning al vaak. Tijdens deze bijeenkomsten ligt de nadruk op positieve gezondheid, waardoor informele oplossingen vaak voor de hulpvragen ingezet kunnen worden. Dit zijn zaken als 'hoeskamer bezoeken', een</p>

	'wat heb ik nodig'. Voor de organisatie is het een model voor 'werkendeweg' ontwikkelen. Kern is dat er één integrale, domeinoverstijgende (0e, 1e, 2e lijn) aanpak is. Een coördinerend verpleegkundige en de dorpsondersteuner faciliteren de samenwerking tussen gemeenschapszorg en professionele zorg.				wandelmaatje, een maatje om spellen mee te spelen tot het uitzoeken en aanschaffen van een sociaal personenalarm. De link tussen het informele en formele netwerk is sterk. Waar het kan worden hulpvragen informeel opgelost, waar het nodig is wordt professionele hulp ingeschakeld.
RD3 Wat kies jij?	Stichting 'Wat kies jij?' wil alle 280.000 inwoners van Noord-Limburg inspireren, informeren en activeren tot het maken van gezonde keuzes.	Regio Deal, termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/20 - 01/01/23	In 2022 zijn er binnen het overkoepelende project 'Wat kies jij?' vijftien subprojecten uitgevoerd. Deze hebben ofwel als doel het positief in beeld brengen van de regio, dan wel het bereiken van inwoners om gezonde keuzes te maken. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met een fotowedstrijd, waar inwoners hun eigen gezonde keuze fotografeerden.
RD4 Burgerinitiatieven en Positieve Gezondheid in de huisartsenzorg	In 2023 zijn het aantal diagnostische tests en het aantal medicatie voorschriften niet gestegen tot meer dan 75% van het niveau van 1 januari 2020. Vanaf 2021 neemt het aantal verwijzingen naar de tweedelijns zorg gestaag af voor de huisartsenpraktijken die werken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid.	Regio Deal, termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 01/01/24	Sinds het derde kwartaal van 2022 is deze belangrijke mijlpaal bereikt: er doen inmiddels 25 praktijken mee. Hiermee heeft het project een bereik van 50% van het aantal patiënten (136.000) en inwoners (277.000) in het werkgebied. Deze praktijken zijn inmiddels aan de slag met de projectdoelen en de daaraan gekoppelde interventies: werken volgens Positieve Gezondheid/persoonsgerichte zorg en 'anders doorverwijzen'.

	<p>Huisartsenpraktijk verwijzen vanaf 1 oktober 2023 aantoonbaar kwetsbare burgers met niet-medische hulpvragen naar lokale burgerinitiatieven, die actief en effectief met de huisartsenpraktijken samenwerken.</p> <p>Op 1 januari 2024 is er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken partijen in de regio in samenwerking met de Nederlandse Zorg Autoriteit.</p>				
RD5 Programma Jeugd, Voeding & Gezondheid	<p>Versterken leerstoel middels wetenschappelijk onderzoek en opzet van een masterprogramma Jeugd, Voeding en Gezondheid.</p> <p>Een co-creatie en valorisatie aanpak ontwikkelen voor voedingsinnovatie.</p> <p>Validatie en implementatie van voedseducatieprogramma's.</p> <p>Ontsluiten en toegankelijk maken van kennis.</p>	Regio Deal, termijn 1		Lopend 01/01/21 - 01/01/24	<p>Binnen het programma Jeugd, Voeding & Gezondheid wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de invloed van voeding en de manieren om kinderen bij te brengen hoe zij goede voeding kunnen binnenkrijgen. Daarnaast wordt dit gekoppeld aan de praktijk, waarbij kinderen leren koken en leren waar hun eten vandaan komt.</p> <p>De doelen van het project zijn vierledig: het versterken van de leerstoel; co-creatie om methoden te ontwikkelen om voedingsinnovatie te valoriseren; voedseducatieprogramma's valideren en implementeren; en kennis toegankelijk maken. Op alle vier deze doelen is in 2022 voortgang behaald.</p> <p>Het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld enkele onderzoeken gedaan, zoals naar de effecten van de leerstraat op kennis, houding en smaakvoorkeur van kinderen. Die leerstraat is tegelijkertijd in de praktijk toegepast: 1.958 kinderen hebben in 2022 een leerstraat gevolgd.</p>
RD25 LiFi / GBT: Limburg Fit / Gezondste	<p>De ambitie van LiFi is om impact te hebben op elk kind in Noord Limburg. Ieder kind heeft zijn eigen</p>	Regio Deal, termijn 2		Lopend 01/01/21 - 31/12/23	<p>Er zijn 2 basisscholen gestart als Gezonde Basisschool van de Toekomst in Venlo. De verkenning of de Gezonde Basisschool haalbaar is, verloopt daarnaast in meerdere gemeentes met succes. Deze gemeentes bevinden zich echter nog niet in een fase van het opstarten</p>

Basisschool van de toekomst	problematiek en eigen verhaal. In Noord-Limburg is daarvoor eind 2019 een unieke samenwerking ontstaan tussen publieke en private organisaties om juist nu te investeren in een gezonde jeugd.				van een dergelijk project, hier willen zij eerst gedegen onderzoek voor doen. In Venlo zijn echter plannen voor nog twee Gezonde Basisscholen van de Toekomst vanaf september 2023.
-----------------------------	--	--	--	--	--

4.5 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor de tweede termijn Regio Deal en eerste en tweede enveloppe Investeringsagenda.

Regio Deal

Eerste termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 2 - Vitaal en gezond			
Ontwikkelplan Gezondste Regio 2020-2022	€ 980.000	€ 300.000	€ 680.000
Burgerparticipatie en huisartsenzorg	€ 1.090.000	€ 545.000	€ 545.000
Programma Jeugd, voeding en gezondheid	€ 2.500.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000
Subtotaal thema 2	€ 4.570.000	€ 2.095.000	€ 2.475.000

Tweede termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio

Thema 2 - Vitaal en gezond			
LIFI	€ 2.986.568	€ 900.000	€ 2.086.568
Subtotaal thema 2	€ 5.973.136	€ 2.986.568	€ 900.000

Investeringsagenda

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Gezonde basisschool en kinderopvang: Cultuur op recept	€ 36.450	€ 14.000	€ 22.450
Leren, werken en ontwikkelen Arbeidsontwikkeling vd toekomst Gennepe	€ 391.038	€ 193.538	€ 197.500
Leren, werken en ontwikkelen Leerwerkhuis P&M	€ 371.751	€ 122.249	€ 249.502
Leren, werken en ontwikkelen Wijkleerbedrijf Venray	€ 339.713	€ 111.713	€ 228.000
Zorgeloos wonen	€ 105.000	€ 52.500	€ 52.500
Transformatieplan jeugd	€ 355.000	€ 177.500	€ 177.500
Integrale wijkaanpak vitale gemeenschappen (Centrum west venray)	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Integrale wijkaanpak vitale gemeenschappen (Horst-west)	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Subtotaal programma 2	€ 1.698.952	€ 721.500	€ 977.452

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio

Programma 2 - Vitaal en gezond			
Regionaal servicepunt arbeidsmigranten Meterik	€ 180.000	€ 90.000	€ 90.000
10.000 talenplan voor werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen	€ 76.000	€ 38.000	€ 38.000
Vitaliteitscoöperatie America Left	€ 130.000	€ 60.000	€ 70.000
Wijkaanpak Gennep Zuid	€ 698.791	€ 298.549	€ 400.242
Preventieakkoord, o.a. Jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie	€ 520.000	€ 260.000	€ 260.000
Subtotaal programma 2	€ 1.604.791	€ 746.549	€ 858.242

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

5



**Toerisme en
leisure**


Toerisme en Leisure: Gezond Leven

5.1 Inleiding

De Regio Noord-Limburg streeft naar een vitale toerisme- en leisuresector die een sociaaleconomische motor vormt voor de regio en bijdraagt aan een gezond leven. Noord-Limburg wil in 2025 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied voor *shortbreak* vakanties zijn, met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen. Daarbij focust de regio op eigentijdse en hoogwaardige familierecreatie. De inspanningen moeten leiden tot een groei van de jaarlijkse vrijetijdsbestedingen in de regio naar ruim €1 miljard in 2025.

De programmadoelen zijn als volgt opgebouwd:

FIGUUR 8. PROGRAMMALIJNEN EN -DOELEN TOERISME EN LEISURE

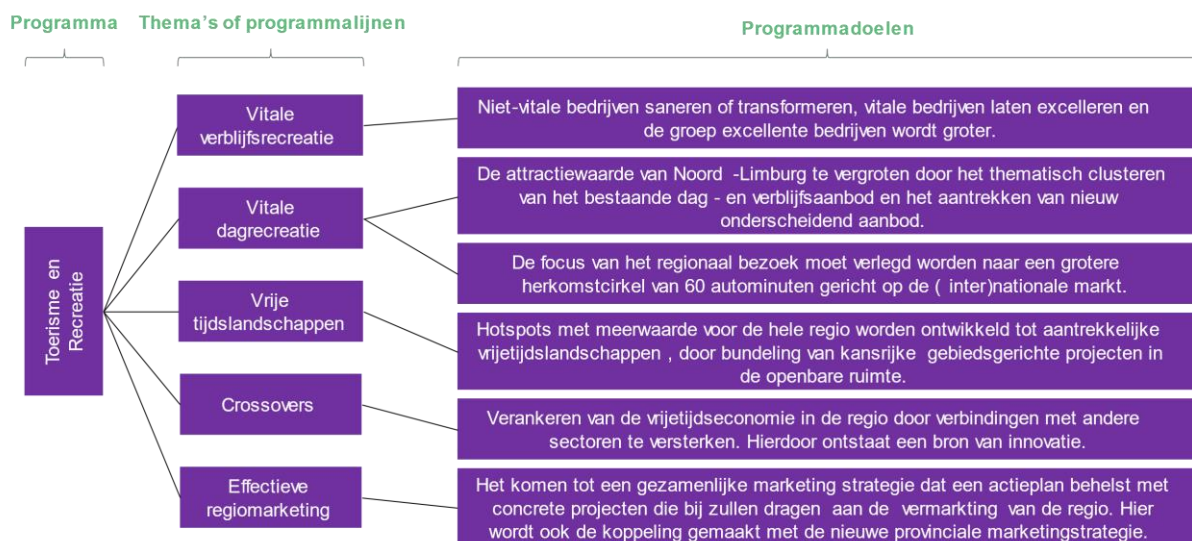

5.2 Ontwikkeling Brede Welvaart

FIGUUR 9. CBS BREDE WELVAART DATA TOERISME EN LEISURE

Welzijn	Wonen
<p>Tevredenheid met vrije tijd (2021)</p> <p>75,0% 33^e van de 40</p>	<p>Afstand tot sportterrein (2017)</p> <p>1,0 km 13^e van de 39</p>
<p>Natuurgebied per inwoner (2017)</p> <p>63ha 7^e van de 39</p>	

N.B. De nummering geeft de positie aan van de Regio Noord-Limburg ten opzichte van andere COROP-regio's. Deze brede-welvaartindicatoren geven veranderingen in de statistieken weer. Dit vraagt om een zorgvuldige interpretatie, immers het aantonen van causaliteit (oorzaak en gevolg) en eventuele correlatie (statistische samenhang) vereist nader onderzoek.

5.3 Voortgang Programma

Het programma Toerisme en Leisure kent een goede voortgang. Na de drie projecten uit de eerste enveloppe, zijn er in 2022 in de tweede enveloppe van de Investeringsagenda tien projecten van start gegaan. De drie projecten uit de eerste enveloppe zijn inmiddels afgerond, waarbij de projecten 'Toeristische Overstappunten' en 'Crossovers Agrofood leisure' in de tweede enveloppe zijn verlengd. De doelen voor deze projecten zijn gehaald en er wordt positief gekeken naar de voortgang in de huidige verlenging. Vier projecten uit de tweede enveloppe zijn nog niet beschikt en gestart in 2022.

Er wordt momenteel actief samengewerkt met betrokken ondernemers aan de Toeristische Overstappunten. Ook loopt een aanbesteding om een marketingplan hiervoor te maken. Daar zijn ook de provincie en Regio Midden-Limburg bij aangehaakt. Dit om het plan van de Toeristische Overstappunten later ook uit te rollen in de rest van de provincie. De Regio Noord-Limburg heeft hierbij een voortrekkersrol.

5.4 Samenwerking en Proces

Het programma bouwt voort op een sterke en al langer lopende regionale samenwerkingstraditie rondom toerisme. Het programma sluit aan bij het Actieprogramma Vrijtijdseconomie dat is opgesteld voor de periode 2018-2025. Elke twee weken is er een projectteamoverleg tussen de ambtelijke medewerkers op toerisme en recreatie vanuit de aangesloten gemeenten. Er is een grote betrokkenheid van ambtenaren uit de verschillende gemeenten, vanuit een gedeeld gevoel van belang.

Ook bestuurders zijn nauw betrokken bij de samenwerking voor toerisme en recreatie. De herijking van het actieprogramma, die in 2022 en begin 2023 heeft plaatsgevonden, heeft daar een bestuurlijke impuls aan gegeven. Bestuurders gaven expliciet aan dat zij betrokken wilden worden. De vijf actielijnen uit het programma (zie **Figuur 8**) waren al over verschillende ambtenaren verdeeld, maar zijn nu ook bestuurlijk verdeeld. Het belang van samenwerken wordt in de herijking bij het actieprogramma ook genoemd in relatie tot regiomarketing. De noodzaak voor een ambitieus marketingprogramma – in samenwerking met de provincie Limburg als geheel – wordt hierin uitgesproken en vormt een doel voor de komende jaren.

5.5 Voortgang en ontwikkelingen per project

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Termijn/ Enveloppe	Beschikt?	Status/ Looptijd	Voortgang
IA021 Toeristische Overstappunten (TOPs)	De realisatie van 20 á 25 Toeristische Overstappunten (TOPs) in Noord-Limburg. Een TOP is een 'knooppunt' waar o.a. diverse bewegwijzerende fiets- en wandelroutes samen komen. Een TOP is goed bereikbaar per auto en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Bij de TOP of in de nabije omgeving van de TOP is horeca te vinden.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Afgerond	<p>TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Noord-Limburg heeft heel veel recreatieve routes, waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen of paardrijden. Het wordt allemaal nog prettiger als je de auto gemakkelijk kunt parkeren, van route kunt wisselen of onderweg iets kunt eten of drinken. Met deze Toeristische Overstappunten (TOP) profiteren onze ondernemers optimaal van de vele bezoekers.</p> <p>De Provincie Limburg wil het project uitrollen over de hele provincie en ontwerpt een landmark/herkenningsteken. Strategische locaties voor TOP's zijn in beeld maar nog niet definitief vastgesteld. Gekeken wordt naar (de aanleg van) voorzieningen als parkeerplaats, bankje, prullenbak, fietsreparatieset, elektrische laadpaal en infoborden over andere TOP's.</p> <p>Dit project is inmiddels afgerond. De fysieke uitvoering van het project zal in een tweede enveloppe worden voortgezet. In het projectplan dat nu is opgesteld, zijn de volgende zaken opgenomen: definitieve criteria, spreiding van de TOPs, een uitwerking van de conceptbegroting, planning en een beschrijving van de te nemen stappen in de uitvoering.</p>
IA022 Crossover Agrofood en Leisure	De realisatie van een werkgroep gericht op kennisoverdracht tussen ondernemers uit de agrofood en recreatieve sectoren. In dit project wordt toegewerkt naar de realisatie van de cross-overs tussen agrofood en recreatie in Noord-Limburg met nieuwe verdienmodellen voor ondernemers.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Afgerond	Het project is afgerond, de eindrapportage ter vaststelling van de subsidie is inmiddels verleend. Agrariërs werken nu samen met de toeristische sector. Gezamenlijk bieden ze leuke arrangementen aan, zoals een fotoshoot op een boerderij, een workshop koe knuffelen of genieten van streekproducten.

	In zowel de werkgroep als de participantengroep worden ongeveer 20 ondernemers betrokken				
IA023 Kwaliteitsverbetering Veer Reuver	De locatie aan de Maas tot een recreatief toeristisch overstappunt transformeren.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Afgerond	De Maas is een belangrijke ader door Noord-Limburg. De ambitie is om de Maas meer in de spotlights te zetten zodat iedereen kan genieten van deze mooie rivier. Daarvoor worden bijzondere plekken langs de Maas nog aantrekkelijker voor inwoners én bezoekers. Het gebied bij het veer tussen Reuver en Kessel wordt aan de zijde van Reuver opnieuw ingericht. Het gebied verandert in een plek om fijn te vertoeven tussen fruitbomen en bloemrijke graslanden. De kwaliteitsverbetering van de veerstoep in Beersel is afgerond. Het parkeerterrein is heringericht, straatmeubilair is geplaatst, bomen zijn geplant en bloemrijk grasland is gezaaid. De voorgaande doelstellingen voor dit project zijn gehaald. Daarmee is het project afgerond. Er is een eindrapportage aangeboden aan de Regio en Provincie.
IA052 - Platform Agrotourisme	Het platform is een vervolg op het eerdere project Crossover Agrofood en Leisure. Het stelt ten doel om 50 partners te acquireren, een belevingsplatform op te zetten, 20 arrangementen per jaar te valideren en 1.000 boekingen per jaar te realiseren	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/03/22- 31/12/23	
IA053 - Vrijetijdspark Ooijen-Wanssum	Het doel van het project is het ontwikkelen van een nieuwe regionale dagrecreatie-trekker gericht op outdoor activiteiten in het	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Gestart met plan van aanpak	Het plan van aanpak voor dit project is nog niet goedgekeurd. Er is dus nog niet begonnen met dit project.

	Maaspark Ooijen-Wanssum				
IA054 - Venlo Convention Bureau	Het project beoogt een conventionbureau op te richten om zakelijk toerisme te bevorderen. De eerste twee jaar moet dit leiden tot een toename van 4.000 zakelijke toeristen, waarvan er 2.000 overnachten.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend	Het project heeft vertraging opgelopen door de coronapandemie, doordat het bureau tot februari 2022 dicht bleef. Hierna kon het open en heeft het geholpen bij 5 bemiddelingen bij aanvragen. In plaats van de eerder gestelde einddatum van 30 juni 2023, heeft het project dan ook uitstel gevraagd tot 31 december 2023.
IA057 - Keramiekindustrie	Het project maakt de keramiekgeschiedenis beleefbaar en zichtbaar en versterkt zo de dagattractieve waarde van de regio. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een lichtkunstwerk te realiseren, enkele restauraties toe te passen en de bestaande uitingen beter te positioneren.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Geen voortgang over 2022	Door capaciteitsproblemen is er pas in 2023 met dit project gestart.
IA058 - Genneper Huys	Het Genneper Huys wordt met dit project weer beleefbaar gemaakt op de plek van de ruïne, het centrum van Gennep op plekken van de circumvallatielinie (verdedigingswerk van belegeraars)	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Geen voortgang over 2022	Dit project is pas in 2023 beschikt.
IA061 - Groene Hart Musschenberg	Het Groene hart Musschenberg Kessel-Eik versterkt de verbinding van de kern Kessel-Eik met de Maas. Het gebied	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend	Er is een wandel-/struinp pad gerealiseerd en de recreatieve paden zijn vrijgemaakt. Overige beoogde tussendoelen hebben een omgevingsvergunning nodig. Deze aanvragen lopen al enige tijd maar vanwege de vele stakeholders zijn er veel stappen nodig om deze vergunningen te krijgen.

	wordt door de maatregelen ook beter ontsloten voor (dag)recreanten uit de regio en toeristen.				
IA064 - TOP's	Het ontwikkelen en realiseren van 20 a 25 TOP's in Noord-Limburg conform het projectplan TOP's. Er komt een provinciaal beeldmerk bij de TOP's dat in alle regio's wordt gehanteerd. Het beeldmerk moet voldoen aan de eisen van de Provincie, die worden afgestemd met de verschillende regio's.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 30/11/21- 31/12/24	Sinds de beschikking van begin 2022 is er veel gebeurd. Allereerst is er gezocht naar geschikte locaties voor de TOP's en zijn de beoogde ondernemers bij het project betrokken. Momenteel zijn er ca. 15 ondernemers die hebben aangegeven mee te willen doen. Met hen wordt het nu verder uitgewerkt. In de zomer van 2022 heeft een aanbesteding uitgestaan voor het beeldmerk. Dit heeft geresulteerd in de naam Eikpunten. De provincie heeft dit getrokken en de andere regio's zijn hier ook bij betrokken. Er is nu een huisstijl, naam en landmark. Ook is dit afgestemd met de aangesloten ondernemers. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het aanbesteden van het marketingplan voor het project. Parallel daaraan wordt per locatie bekeken welke ingrepen er nodig zijn om de locatie geschikt te maken voor de TOP en worden daarover afspraken gemaakt met de ondernemers en gemeenten.
IA065 - Regionale MTB-route	Met het project worden er nieuwe mountainbike-routes aangelegd waardoor er een regionaal dekkend netwerk ontstaat van aaneengeschakelde mountainbikeroutes.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/04/22- 31/12/24	Er hebben in 2022 voorbereidende werkzaamheden en gesprekken plaatsgevonden. Zo is er een kaartstudie gedaan om huidige en mogelijke toekomstige mountainbikeroutes in kaart te brengen. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met terreineigenaren en mountainbikeclubs om de vervolgfase vorm te geven.
IA067 - VVV Inspiratiepunt Beesel	Het nieuwe VVV kantoor bij Landal De Lommerbergen maakt een omslag van informatie naar inspiratie. Op een visuele en interactieve manier wordt de bezoeker over de omgeving geïnspireerd en	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Afgerond	Het VVV Inspiratiepunt is geopend in het receptiegebouw van Landal de Lommerbergen. Het is een interactief VVV Inspiratiepunt geworden. Bezoekers krijgen op een verrassende manier informatie over de omgeving. De ruimte is gethematiseerd naar de legende van Sint Joris en de Draak, die een belangrijke rol speelt in de gemeente Beesel. Op diverse plekken zijn interactieve elementen toegevoegd. Zo is er een verhalenboom met tips en verhalen van de

	<p>verleiden we ze om een bezoek te brengen aan de belevenissen in de regio. Het inspiratiepunt dient als voorbeeld voor andere mogelijke locaties bij verblijfsrecreatie in de regio</p>				<p>boswachter of de burgemeester van Beesel. Of je kunt je hand op een drakenpoot leggen, waarna er informatie verschijnt over een bezienswaardigheid. Bijzonder zijn ook de twee drakeneieren met informatie over streekproducten en natuur. In de eieren zijn schermen, vitrines en diverse andere technieken gebruikt om bezoekers te inspireren.</p>
--	---	--	--	--	--

5.6 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor de eerste en tweede enveloppe Investeringsagenda.

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Kwaliteitsverbetering omgeving veer Reuver	€ 80.000	€ 40.000	€ 40.000
Realisatie cross-over tussen agrofood en recreatieve sector	€ 68.250	€ 33.575	€ 34.675
TOP Netwerk Noord-Limburg	€ 6.100	€ 2.900	€ 3.200
Subtotaal 3	€ 154.350	€ 76.475	€ 77.875

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio

Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Agrotoeristisch Platform	€ 175.004	€ 87.504	€ 87.500
Venlo Convention Bureau	€ 80.000	€ 40.000	€ 40.000
Groene Hart Musschenberg Kessel Eik	€ 64.900	€ 37.500	€ 27.400
Toeristische overstappunten	€ 500.000	€ 250.000	€ 250.000
Regionale MTB route	€ 181.000	€ 90.500	€ 90.500
Keramiekindustrie	€ 243.500	€ 140.000	€ 103.500
Immaterieel erfgoed Sint Joris en de Draak	€ 790.000	€ 395.000	€ 395.000
Genneper Huys	€ 600.000	€ 300.000	€ 300.000
Weverlose Volmolen en Schans	€ 250.000	€ 150.000	€ 100.000
Venray Remembers	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Toeristisch Hart Plasmolen	€ 1.200.000	€ 500.000	€ 700.000
VVV Inspiratiepunt	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000
Vrijetijdspark Wanssum/Maaspark Ooijen-Wanssum i.o.	€ 262.000	€ 140.000	€ 122.000
Subtotaal 3	€ 4.506.404	€ 2.210.504	€ 2.295.900

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

6



Landelijk
gebied

Landelijk Gebied: Gezonde Leefomgeving

6.1 Inleiding

Het programma Landelijk Gebied kent twee thema's: Ruimte en Veiligheid. Het programma richt zich enerzijds op een landelijk gebied met een hogere natuur- en cultuurhistorische kwaliteit, met ruimte voor economische activiteiten en ruimte voor eisen die de energietransitie, de transformatie in de agrarische sector, waterveiligheid en waterkwaliteit stellen. Anderzijds zet het programma in op het versterken van de informatiepositie op het gebied van veiligheid, het vergroten van bewustzijn over signalen die kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten en het stimuleren van meldingsbereidheid. Het Regionaal Interventieteam (RIT) beoogt als toonaangevend project het tegengaan van ondermijnende criminaliteit aan te jagen en te coördineren. Binnen het thema Ruimte is Maasheggen een belangrijk project voor het herstel van het karakteristieke Maasheggen landschap aan de oostoever van de Maas.

Regio Deal

Binnen het programma Landelijk Gebied wordt zowel vanuit de Investeringsagenda als de Regio Deal samengewerkt. Specifiek valt hieronder het Regio Deal-thema Veilige en Leefbare Omgeving.

FIGUUR 10. PROGRAMMADOELEN



6.2 Ontwikkeling Brede Welvaart

FIGUUR 11. CBS DATA BREDE WELVAART LANDELIJK GEBIED

Wonen	
<p>Tevredenheid met woonomgeving (2021)</p> <p>85,4%</p> <p>21^e van de 40</p>	<p>Tevredenheid met woning (2021)</p> <p>89,7%</p> <p>6^e van de 40</p>
<p>Afstand tot sportterrein (2017)</p> <p>1,0 km</p> <p>13^e van de 38</p>	<p>Afstand tot basisschool (2021)</p> <p>0,8 km</p> <p>20^e van de 40</p>
<p>Afstand tot café e.d. (2021)</p> <p>0,8 km</p> <p>3^e van de 40</p>	

Samenleving	
Contact met familie, vrienden of buren (2021) 70,8% 20^e van de 40	Vertrouwen in instituties (2021) 62,7% 35^e van de 40
Vertrouwen in anderen (2021) 61,1% 32^e van de 40	Vrijwilligerswerk (2021) 38,5% 28^e van de 40

N.B. De nummering geeft de positie aan van de Regio Noord-Limburg ten opzichte van andere COROP regio's. Deze breedewelvaartindicatoren geven veranderingen in de statistieken weer. Dit vraagt om een zorgvuldige interpretatie, immers het aantonen van causaliteit (oorzaak en gevolg) en eventuele correlatie (statistische samenhang) vereist nader onderzoek.

6.3 Voortgang Programma

Het programma Landelijk Gebied bestaat uit twee thema's: Landelijk Gebied (Ruimte) en Veiligheid. Thema Veiligheid heeft dertien projecten lopen in de eerste en tweede tranche van de Regio Deal. In beide deelprogramma's is de voortgang positief.

Voor het programma Landelijk Gebied is in 2022 nagedacht over de toekomst van de uitvoering, voor 2024-2027. Er ligt een grote opgave in het landelijk gebied – denk aan stikstof, droogte, wateroverlast en vrijgekomen locaties van agrarische ondernemingen – en er zijn veel raakvlakken tussen Landelijk Gebied en Klimaat. Vanaf 2024 wordt Landelijk Gebied losgekoppeld van Veiligheid en samengevoegd met Klimaat tot het programma Ruimte. Het thema Veiligheid wordt een afzonderlijk programma.

Op het gebied van veiligheid is er een grote impact te zien binnen de regio. Dit komt met name doordat partijen elkaar veel beter weten te vinden doordat zij structureler samenwerken. Het programma zorgt ervoor dat men zich bewust wordt van ondermijning en er ook tegen opgetreden kan worden. Het 'Regionaal InterventieTeam' ACT!, bijvoorbeeld, bezoekt veel meer locaties dan in de beschikking afgesproken. Anders dan voorafgaand aan deze samenwerking kan er binnen twee dagen na een melding een team klaarstaan om hierop te acteren. Het project Data Driven opsporingsmethoden kan daarnaast door het samenbrengen van bestaande data in toenemende mate de locatie van de bron van drugsdumpingen te achterhalen.

6.4 Samenwerking en Proces

De samenwerking binnen het programma verloopt goed. Voor de Regio Deal wordt nauw samengewerkt met de Provincie. Wat daarbij helpt is dat binnen de Regio Deal door de Provincie Limburg separaat is begroot voor het thema Veiligheid. Daardoor kunnen de middelen gemakkelijk worden toegewezen aan de projectvoorstellen die gehonoreerd worden. Deze kunnen daardoor ook gemakkelijker uitgevoerd worden. Deze wijze van begroten door de Provincie Limburg geldt niet voor de Investeringsagenda – en dus het thema Ruimte.

Binnen de projecten verloopt de samenwerking ook goed. De programmamanager overziet het geheel en stuurt op de besluitvorming. Voor elk project is daarnaast een projectteam samengesteld, waarin de inhoudelijke uitwerking van het betreffende project of de projecten plaatsvindt.

6.5 Voortgang en ontwikkelingen per project

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Termijn/ Enveloppe	Beschikt?	Status/ Looptijd	Voortgang
RD10 Regionaal InterventieTeam ACT! (RIT)	Het instellen van één intergemeentelijk interventieteam voor de Regio Noord-Limburg dat diverse initiatieven (zie Regiodeal) in het tegengaan van ondermijnende criminaliteit aanjaagt en coördineert. Een jaarlijkse controle van ongeveer 180 panden door handhavende instanties, samengebracht in het intergemeentelijke interventieteam.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/21- 31/12/25	Het Regionaal Interventie Team ACT! is opgezet en functioneert inmiddels. In de acht deelnemende gemeentes zijn in 2022 in totaal 186 afzonderlijke locaties bezocht. Het totaal aan gecontroleerde locaties staat daarmee eind 2022 op 349. Hiermee wordt ruim aan de opdracht van gemiddeld 15 locaties per maand voldaan. In 2022 zijn onder andere 8 vakantieparken gecontroleerd (totaal 11), 17 locaties op industrieterreinen (totaal 49) en 17 locaties in het buitengebied (totaal 39). Bij 26 locaties was er mogelijk sprake van arbeidsuitbuiting (totaal 34).
RD11 Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO)	Het realiseren van zes à acht 'Keurmerken Veilig Buitengebied' in de Regio Noord-Limburg	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Afgerond, wordt vervolgd: zie RD33	In totaal zijn er voor de 8 gemeenten in de regio samenwerkingstrajecten opgezet. Per gemeente is het totale buitengebied opgezet als één samenwerkingsverband. Overkoepelend is er een samenwerkingsverband tussen alle 8 gemeenten waarin alle overkoepelende/regio onderwerpen worden opgepakt.
RD12 Innovatieve Controlemethoden	Eerste ervaringen opdoen met het toepassen van drie à vijf innovatieve controle- en handhavingsmethoden die vanuit juridisch en privacy-technisch oogpunt voldoen aan de geldende regelgeving.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 31/12/25	In 2021 is de projectgroep geformeerd en opgestart en heeft een eerste expertmeeting plaatsgevonden. In 2022 is het onderzoek naar innovatieve manieren om controles uit te voeren uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een rapportage en presentatie.

RD13 Data Driven Opsporingsmethoden	Het ontwikkelen van een 'data-driven' aanpak Experimenten in twee wijken waarin het thema veiligheid een belangrijk aandachtspunt is.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 31/12/25	In 2022 is er gewerkt om te verkennen hoe met de huidige beschrijvende data vanuit diverse bronnen te komen naar indicatoren met een voorspellende waarde. Het doel is om met deze data de inzet van de beperkt beschikbare toezicht- en opsporingscapaciteit meer gericht in te kunnen zetten. Gedurende 2022 blijkt keer op keer dat het met elkaar combineren van data uit open en gesloten bronnen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan zeer complex blijkt binnen de huidige privacywetgeving. Gedurende 2023 gaat de projectgroep zich richten op het proberen te slechten van deze juridische hobbels. Het streven is om naast de regionale juridische adviseurs ook de juristen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, als mede-belanghebbende bij de Regiodeal Noord-Limburg in de vorm van een regionaal experiment te gaan betrekken bij het komen tot een oplossing voor dit probleem.
RD14 Bewustwording Meld Misdaad Anoniem (MMA)	Het sluiten van een convenant met NL Confidential zodat de 'meld misdaad anoniem' - meldingen beschikbaar komen voor de bevoegde instanties.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 31/12/25	Er zijn meerdere campagnes, voorlichtingsbijeenkomsten en publieksacties gehouden. De 'Kijk Niet Weg' campagne, die op 14 juni 2022 is gelanceerd, stimuleert bijvoorbeeld het melden van verdachte situaties. Hierbij is ook de samenwerking gezocht met Burgernet en het interventieteam ACT!. Periodiek zijn er verschillende vormen van nieuwe acties om het publiek te informeren over het herkennen van signalen die kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten.

RD15 Verbeteren van de integratie en participatie Internationale Werknemers	Opstellen van provinciaal (ondermijnings-)beeld met betrekking tot arbeidsmigranten in Noord Limburg.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 31/12/25	<p>Dit project is bedoeld voor alle internationale werknemers. Zij zijn onmisbaar voor de regionale economie. Uiteindelijk vestigen veel van hen zich hier definitief. Als zij goed behandeld worden, krijgen waar ze recht op hebben en weten waar zij zich in Nederland aan moeten houden, ontstaan wederzijds begrip, vertrouwen en acceptatie en wordt uitbuiting tegengegaan.</p> <p>Het projectteam is in 2021 gevormd en in 2022 meerdere keren samengekomen. Hieruit blijkt dat er te weinig concrete casuïstiek is om tot een ondermijningsbeeld te komen. Daarom zijn er in 2022 twee werksessies geweest en een diepere inventarisatie van de inzichten. In het voorjaar 2023 wordt gezien of het haalbaar is om data te bundelen en zo te komen tot een zinnige fenomeenanalyse op basis van data uit Noord-Limburg. In 2023 wordt dus opnieuw geïnventariseerd of er voldoende casuïstiek beschikbaar kan komen voor het opstellen van een ondermijningsbeeld.</p>
RD17 Brochure Bewustwording signalen ondermijning	Het uitvoeren van een brede bewustwordingscampagne waarbij vijftien voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor ondernemers en gemeenten.	Regio Deal termijn 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 31/12/25	De tekst voor brochure 'bewustwording signalen ondermijning' is in 2021 afgerond. De brochure is op 14 juni 2022 gepresenteerd, zodat deze gebruikt kan worden om bewoners, ondernemers en bestuurders te wijzen op de signalen van ondermijning. De vormgeving en verspreiding vindt plaats in overeenstemming met de Communicatiestrategie voor het totale programma Veiligheid in 2023.
RD31 Rode en Groene Spoor Vakantieparken	Een overzicht van de problematiek rondom veiligheid op vakantieparken, het vergroten van het bewustzijn en het komen tot een aanpak	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 - 31/12/25	Er is in 2022 een start gemaakt met het opzetten van een actualisatie van de indicatoren voor het groene en rode spoor en de bijbehorende monitoringstool. Daarnaast is ook begonnen met het opzetten van de kennissessies om het bewustzijn bij gemeenten en andere partners te vergroten.

RD32 Innovatie aanpak synthetische drugscriminaliteit Fase 2	Ontwikkeling en implementatie van een innovatieve controlemethode die Limburgse gemeenten (en hun veiligheidspartners) kunnen inzetten om chemische stoffen in de buitengebieden, die gerelateerd zijn aan de productie van synthetische drugs (en eventueel hennep), te traceren om de pakkans te vergroten.	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 - 31/12/25	Voor het project Innovatieve Controlemethoden is in 2021 voor de eerste tranche van de Regio Deal de projectgroep geformeerd en opgestart en heeft een eerste expertmeeting plaatsgevonden. In 2022 is het onderzoek naar innovatieve manieren om controles uit te voeren uitgevoerd. Gedurende 2023 wordt een Plan van Aanpak opgesteld hoe opsporingsmethoden op het gebied van Sensing en Data toe te passen. Zodra dit Plan van aanpak gereed is in 2023 en de 10 gerichte interventies op basis van Sensing en Data met positief resultaat zijn uitgevoerd door het ACT! Interventieteam wordt een aanvang gemaakt met het meer structureel inzetten van de Innovatieve Controlemethode die deze kpi betreft.
RD33 Procesbegeleiding en uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen – Buitengebied	Het project beoogt een netwerk voor alle KVO gebieden in Noord-Limburg op te stellen, met een procesbegeleider die dit overziet.	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 - 31/12/25	Er is een nieuwe procesbegeleider aangesteld in 2022, maar die begint pas in 2023 met zijn werkzaamheden. Overkoepelend is er een samenwerkingsverband tussen alle 8 gemeenten waarin alle overkoepelende/regionale onderwerpen worden opgepakt.
RD34 Restorative Justice: Herstelconferenties Noord-Limburg	Er wordt gericht op het houden van 10 conferenties met daders en slachtoffers. Daarnaast beoogt het project een training herstelrecht aan 16-20 professionals te geven. Op basis van de uitkomsten worden conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 - 31/12/25	In 2022 zijn vier trainingen van 1,5 uur gegeven. Ook voor betrokken partijen als jeugdwerk, zorg- en veiligheidshuis, Openbaar Ministerie, Politie en reclassering. De trainingen erg positief ontvangen ook bij de drie in 2022 deelnemende gemeenten. De gemeenten Venray en Horst hebben al mogelijke casussen voor een herstelconferentie aangedragen. Hierop moet in 2023 nog een voorselectie plaatsvinden om de geschiktheid van de casus te toetsen. Daadwerkelijk doorgaan van een herstelconferentie is afhankelijk van het instemmen van het slachtoffer en de dader.

RD35 Toekomstperspectief Locaties Stoppende Agrarische Ondernemers (TSAO)	Opstellen van een adviesrapport voor minimaal 10 concrete casussen van stoppende agrarische ondernemers, om hen te stimuleren het (toekomstig) leegstaand agrarisch vastgoed te hergebruiken, herbestemmen of slopen.	Regio Deal termijn 2	Beschikt	Lopend 01/01/22 - 31/12/25	In 2022 is de projectgroep geformeerd door de regiogemeenten. De Projectgroep heeft een Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak staat beschreven hoe de kpi gerealiseerd kan worden. Er is gestart met de inventarisatie van casussen waar een transformatie aan de orde gaat zijn. In 2023 wordt gestart met het concreet uitwerken van de eerste casussen. Ook in 2023 gaat nog verder gewerkt worden om het aantal geschikte locaties voor het transformatietraject verder uit te breiden.
IA025 Grenzeloos meten	Werkend platform, metingen luchtkwaliteit (stikstof en ammoniak) in Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas (Tussen)rapportage resultaten meetnetwerk.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21 - 31/12/24	Het doel van het project is het verbeteren van de luchtkwaliteit rond agrarische bedrijven. Dit project is een vervolg op het meetproject 'Boeren en Buren'. De gegevens hiervan waren door corona-gerelateerde vertraging pas in juli 2021 beschikbaar. In 2021 zijn dan ook geen metingen uitgevoerd, al zijn er wel goede stappen gezet in de samenwerking met andere partijen, in dit geval de Provincie Brabant.
IA026 Maatwerkversneller voor het landelijk gebied	Kennisdeling tussen gemeenten over zes tot acht innovatieve maatwerkoplossingen in 2023 over veranderend gebruik van agrarische bedrijfslocaties.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Opstart-fase 01/12/21 - 01/12/24	De maatwerkversneller geeft overheden en ondernemers meer zicht op oplossingen voor vrijkomende agrarische locaties in het buitengebied. Dit project heeft als doel te leren van 'best practices' van geslaagde transformaties over hoe vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties het best benut kunnen worden. Een derde partij wordt in 2022 aangesteld om hiervoor casussen te zoeken en te bestuderen. Het project is gestart. Er ligt een opdracht voor het opstellen van een handboek. In dit handboek staan tien voorbeelden beschreven van de transformatie van agrarische bedrijven na bedrijfsbeëindiging. Het handboek bestaat uit interviews met de tien agrarisch ondernemers en is bedoeld om te helpen transformaties van andere (voormalige) agrarische bedrijfslocaties in de regio Noord-Limburg gerealiseerd te krijgen.

IA027 Maasheggen (Bergen, Gennep, Mook & Middelaar)	Terugbrengen van 62,5 km groene heggen, herstel van 15 km heggen en 2650 overstaanders (bomen) in 2023.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Opstart-fase 01/12/21-31/12/25	Het Maasheggenlandschap is een landschappelijke schoonheid met een grote soortenrijkdom, streekeigenheid en multifunctionaliteit. We zoeken aansluiting bij de Brabantse oever van de Maas waar de UNESCO-status van biosfeergebied (UNESCO Man & Biosphere) al aan is toegekend. Vanwege de omvang en complexiteit van dit project was veel werk nodig om een goede governance in te richten en de bestuurlijke afstemming in goede banen te leiden. Door de omvang van het project heeft het een langere doorlooptijd nodig. Het gaat om landschapsherstel door aanplanten 62,5 km heggen, herstel circa 15 km heggen en aanplant van 2650 bomen. Er is een stuurgroep ingesteld van de drie betrokken gemeenten. De projectorganisatie wordt ingericht. Vanaf 2023 wordt hier met 15,2 km nieuwe heg en 906 nieuwe bomen nog een uitbreiding aan gegeven met Maasheggen deel II.
---	---	---------------------------------	----------	-----------------------------------	---

6.6 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor de tweede termijn Regio Deal en eerste en tweede enveloppe Investeringsagenda.

Regio Deal

Eerste termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 4 - Veiligheid			
Intergemeentelijk interventieteam Noord-Limburg	€ 640.000	€ 320.000	€ 320.000
Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied	€ 120.000	€ 60.000	€ 60.000
Innovatieve controle-methoden	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Wijkgerichte 'data driven' aanpak	€ 75.000	€ 37.500	€ 37.500
Campagne bewustwording ondermijning en melden (MMA)	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000

Verbeteren voorlichting en integratie arbeidsmigranten	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Startconferentie bewustwording ondermijning	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000
Informatiebrochure ondermijning	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000
Subtotaal thema 4	€ 1.080.000	€ 540.000	€ 540.000

Tweede termijn Regio Deal Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede termijn	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 4 - Veiligheid			
Groene en rode spoor vakantiewoningen (financiering)	€ 538.000	€ 269.000	€ 269.000
Innovatie aanpak synthetische drugscriminaliteit fase 2	€ 600.000	€ 300.000	€ 300.000
Procesbegeleiding en uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen-Buitengebied	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Restorative justice in Noord-Limburg	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen	€ 145.000	€ 72.500	€ 72.500
Subtotaal thema 4	€ 1.533.000	€ 766.500	€ 766.500

Investeringsagenda


Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio

Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Grenzeloos meten	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Maatwerkversneller voor het landelijk gebied	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Landschap Maasvallei – Maasheggen	€ 3.500.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000
Subtotaal 4	€ 3.750.000	€ 1.875.000	€ 1.875.000

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

7

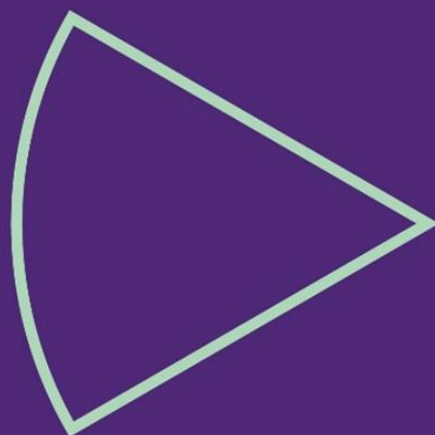

**Mobiliteit
en logistiek**

Mobiliteit en Logistiek: Gezond Verbinden

7.1 Inleiding

Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit de klimaatvriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn met gezonde verbindingen binnen en naar de regio. Mobiliteit is geen doel op zich, maar levert een belangrijke randvoorwaardelijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden in Noord-Limburg. Vaak beogen projecten in dit programma, die zich bijvoorbeeld richten op verbetering van het mobiliteitssysteem of de bereikbaarheid, ook bij te dragen aan de milieu- en energietransitie.

De programmadoelen zijn als volgt opgebouwd:

FIGUUR 12. PROGRAMMALIJNEN EN -DOELEN MOBILITEIT EN LOGISTIEK



7.2 Ontwikkeling brede welvaart

FIGUUR 13. CBS DATA BREDE WELVAART MOBILITEIT EN LOGISTIEK



N.B. De nummering geeft de positie aan van de Regio Noord-Limburg ten opzichte van andere COROP-regio's. Deze brede-welvaartindicatoren geven veranderingen in de statistieken weer. Dit vraagt om een zorgvuldige interpretatie, immers het aantonen van causatie (oorzaak en gevolg) en eventuele correlatie (statistische samenhang) vereist nader onderzoek.

7.3 Voortgang Programma

Binnen het programma Mobiliteit en Logistiek is in 2022 gewerkt aan 16 verschillende projecten. Daarmee wordt ingezet op slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen. Een belangrijk onderdeel van het programma in 2022 was het opstellen van een nieuw visiedocument op mobiliteit: De Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg. De betrokkenen bij het programma geven aan dat veel van de projecten een lange uitvoeringstermijn hebben; met name projecten gericht op gedragsveranderingen zijn niet van de ene op de andere dag gereed. Dit betekent dan ook dat de effecten in 2022 nog beperkt zijn, maar dat de projecten wel op koers liggen. Een andere oorzaak is de reorganisatie van het team bij Trendsportal, de (gemeentelijke) partij die dit programma beheert.

Voortgang binnen het programma is er wel degelijk gehaald, met name op strategisch niveau. Behalve het visiedocument, zijn betrokkenen continu aan het leren van de aanpak van projecten. Voor het project 'Werkgeversaanpak' zoekt dit project aansluiting met Brabant Mobiliteitsnetwerk en Brainport Bereikbaar. De Brabantse mobiliteitscontext komt namelijk goed overeen met de Noord-Limburgse. Dit zorgt voor interessante discussies en de mogelijkheid om van verschillende partijen te leren.

7.4 Samenwerking en Proces

De uitvoering van het programma Mobiliteit en Logistiek valt onder Programmabureau Trendsportal, dat onderdeel is van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Noord-Limburgse gemeenten. Er is een duidelijke takenverdeling tussen de programmamanager en verschillende projectleiders, die worden aangestuurd vanuit Trendsportal. Krapte op de arbeidsmarkt en personele wisselingen waren echter wel een belemmering voor het programma. Vanaf 2023 is er echter wel een aantal nieuwe vaste medewerkers aangenomen, waaronder een full-time programmamanager.

Trendsportal voert naast de werkzaamheden binnen de Investeringsagenda ook veel andere projecten uit. Dit doen zij samen met de partners Supply Chain Valley en Smartwayz, die ook een grote rol spelen. Zo zijn er zelfs al enkele projecten die zonder gemeentelijk of provinciaal geld zijn gefinancierd.

De samenwerking met andere programma's binnen de Investeringsagenda aangehaald als positief. Samen met andere projecten, zoals 'De Verkeersactieve School', raakt mobiliteitsarmoede bijvoorbeeld sterk aan het sociale domein. Hierom is actief de samenwerking gezocht met programmamanagers van het programma Vitaal & Gezond. Deze programmamanagers zien deze samenwerking als logisch en bevorderlijk, al kan het betekenen dat de projecten administratief moeilijker in te delen zijn.

7.5 Voortgang en ontwikkelingen per project

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Termijn/ Enveloppe	Beschikt?	Status	Voortgang
IA30 Bezoekersaanpak	<ul style="list-style-type: none"> • 25 minder autobewegingen door bezoekers op topdagen/evenementen • 15 extra auto's per dag die gebruik maken van parkeren op afstand • 50 meer mensen die op de fiets naar natuurgebieden komen • 3 partijen/trekpleisters aangesloten bij bezoekersaanpak 	Investerings-agenda enveloppe 1 & 2	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/08/23	<ul style="list-style-type: none"> • Eind januari 2022 heeft er een verdiepende sessie plaatsgevonden over Nationaal Park de Maasduinen. Zij zijn ook positief en haken graag aan bij de bezoekersaanpak. • Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden in de kern Arcen. • Door het ontbreken van een projectleider en drukte bij gemeenten stagneerde het project. Inmiddels is een projectleider aangesteld en wordt het project opgepakt.
IA31 Corridoraanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Realisatie van iVRI's in Noord-Limburg op de Corridors Venlo en Gennep • Implementatieplan CTC diensten namens overheid en marktpartijen • Afstemming tussen meerdere logistieke dienstverleners in de regio om in te zetten op CTC-diensten (Connected Transport Corridors)/Talking Trucks. 	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/01/24	<ul style="list-style-type: none"> • Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een extra bijdrage gedaan (toezegging ontvangen) van € 66.000, voor de dekking van het tekort van € 198.000. Ook is een toezegging van een projectbijdrage van € 122.000 verleend voor de dekking van dit tekort. • Tussen september en 1 januari 2023 is een test uitgevoerd met het geven van prioriteit aan vrachtverkeer op de kruising Groot Bollerweg – Venrayseweg in Venlo. Zes logistieke bedrijven namen hieraan deel. I.v.m. technisch functioneren van de app is deze test gestopt. Een alternatieve invulling (onboard-unit Fleet Management Systemen) is in ontwikkeling.
IA32 Nieuwe toekomst platteland / Plattelandsdistributie	<ul style="list-style-type: none"> • Visiedocument Toekomst van het Platteland 	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Stop-gezet	<ul style="list-style-type: none"> • De opstellers van het plan van aanpak hebben aangegeven de begrote middelen (€ 37.250) nodig te hebben voor het opstellen van de visie en geen mogelijkheid te zien het plan zo aan te passen dat het wel financieel haalbaar wordt met het door de regio beschikbaar gestelde budget. • In het PHO RMO d.d. 24-03-2022 is besloten om vooralnog te stoppen met dit project. Te bezien of de inhoud reeds goed

					<p>geborgd wordt in het plan van aanpak van het programma landelijk gebied en de visie (inclusief programma) van het agrofood-cluster Crossroads Limburg. Indien dit niet zo is wordt wellicht een herzien plan van aanpak voor dit project voorgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek heeft uitgewezen dat dit onderwerp op deze wijze niet wordt meegenomen in het programma landelijk gebied. Ook ligt hier de prioriteit niet als gevolg van andere prioriteiten/uitdagingen (bv. stikstof). Hiermee stopt dit project (2022)
IA34 Logistieke aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Benaderde bedrijven om in te zetten op logistieke gedragsverandering • Afname van 4 vrachtbewegingen per dag door slim bundelen en plannen of een modal shift naar water en spoor • 5 Band op spanningacties • 2 minder vrachtbewegingen van groot verkeer per dag in binnensteden door duurzame stadsdistributie 	Investerings-agenda enveloppe 1&2	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/01/23	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn 156 bedrijven benaderd door de Logistiek Makelaars. Hiervan hebben zij er 153 gesproken en aangezet tot minder en duurzamer rijden. 75 bedrijven zijn bezig met het verminderen en verduurzamen van transportbewegingen. • Er is meegedacht over mogelijkheden qua omvang van de zero emissie zone voor stadslogistiek in Venlo. Er is gezocht naar ondersteuning t.b.v. het verkrijgen van draagvlak en ondersteuning op ambtelijk niveau. Dit is gelukt via inzet van een Projectleider die gaat zorgen voor een uitvoeringsagenda en een collega die kan ondersteunen op ambtelijk niveau wanneer dit gewenst is. • Er is een publiek toegankelijke snellaadpaal voor elektrische vrachtwagens in Noord-Limburg (Venray) gerealiseerd. Een andere publiek toegankelijke snellaadpaal heeft geen doorgang gevonden vanwege beperkingen op het net en gebrek aan geschikte locaties. • Er zijn 25 communicatie-uitingen gedaan via o.a. LinkedIn gericht op relevante thema's, waardoor meer bekendheid is gegeven aan de inzet van Logistiek Makelaars en de kansen voor bedrijven. Uitkomst: een totaalbereik van 23.016 mensen, per bericht gemiddeld 959 mensen. • Qua Modalshift-mogelijkheden is er een lijst met leads opgebouwd, maar de subsidie liet op zich wachten. Tijdens het schrijven van deze rapportage is deze net gepubliceerd en wordt er hard gewerkt om de projecten op te starten. • E-Grid innovatie verkennen met Freshpark Venlo. We kijken naar het verduurzamen wagenparken van bedrijven. Via

					Freshpark bereiken we ook andere bedrijven. (E-Grid is het gezamenlijk opwekken, opslaan en verdelen van energie naast gebruik van het net).
IA35a Werkgevers- aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • 1 mobiliteitsmakelaar actief in de regio • 4 aangesloten werkgevers • 15 werknemers meer op de fiets/in het OV • 50 structureel schone autobewegingen door duurzamere aandrijving auto's forenzen 	Investerings- agenda enveloppe 1&2	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/01/24	<ul style="list-style-type: none"> • In samenwerking met het Duurzaam Bedrijvenoverleg (DBO) hebben we in Gennep een mobiliteitsanalyse uitgevoerd voor een negental bedrijven gevestigd op De Grens en De Brem. • In samenwerking met de Ondernemersvereniging Smakterheide (OVS) hebben we in Venray een mobiliteitsanalyse uitgevoerd voor ruim 20 bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Smakterheide. • Op 31 oktober vond de startbijeenkomst 'Mobiliteitsaanpak voor werkgevers plaats'. Hieraan hebben 50 personen deelgenomen. De helft hiervan vertegenwoordigden de grote Noord-Limburgse werkgevers (zowel privaat als publiek). Doel van de startbijeenkomst was op aan te geven hoe we werkgevers ondersteunen bij het geven van invulling aan een duurzaam mobiliteitsbeleid rondom woon-werkverkeer en dienstreizen. Momenteel vinden vervolgesprekken plaats.
IA35b Mobiliteitsportal	<ul style="list-style-type: none"> • 5 bedrijventerreinen aangesloten op het Mobiliteitsportal • 15 werkgevers aangesloten op het Mobiliteitsportal 	Investerings- agenda enveloppe 1&2	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/01/24	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de start van de mobiliteitsaanpak gericht op de werkgevers werd in 2022 gefocust op het project Mobiliteitsportal – de gebiedsgerichte aanpak – met als doel om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. • Vanuit deze gebiedsgerichte aanpak zijn we aan de slag gegaan in Gennep (De Grens De Brem), Horst aan de Maas (Hoogveld) en Venray (Smakterheide). • In samenwerking met het Duurzaam Bedrijvenoverleg (DBO) hebben we in Gennep een mobiliteitsanalyse uitgevoerd voor een negental bedrijven gevestigd op De Grens en De Brem. • In samenwerking met de Ondernemersvereniging Smakterheide (OVS) hebben we in Venray een mobiliteitsanalyse uitgevoerd voor ruim 20 bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Smakterheide.)
IA36 Monitoring en evaluatie	<ul style="list-style-type: none"> • Halfjaarrapportages over voortgang projecten en programma Monitorings- en evaluatieverslag programma Mobiliteit en Logistiek 	Investerings- agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/01/24	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een M&E-coördinator en –adviseur aangesteld • Zij hebben kennisgemaakt met alle projecten en de wensen rondom M&E binnen de projecten geïnventariseerd

IA37 Mobiliteitsarmoede	<ul style="list-style-type: none"> Opleveren van een onderzoek naar mobiliteitsarmoede in Noord-Limburg 	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/07/23	<ul style="list-style-type: none"> In opdracht van Trendsportal heeft Stichting Zet (www.wijzijnzet.nl) een bureau-onderzoek verricht. Vervolgens zijn in Q4/2022 door Zet, in samenwerking met intermediairs zoals Incluzio en Synthese, gesprekken gevoerd met bewoners in de gemeenten Venlo (Venlo-Oost), Venray (Veltum) en Bergen (Wellerlooi). Deze plekken dienen als "gidswijken" voor Noord-Limburg. Hiermee bedoelen we het duiden van eigenschappen en daarmee het profiel van deze gebieden om de herbruikbaarheid van de uitkomsten voor andere dorpen en wijken in Noord-Limburg inzichtelijk te maken. De aanbevelingen voor een gidswijk zijn daarmee ook richtlijnen voor andere dorpen en wijken in Noord-Limburg met hetzelfde profiel. Op dit moment wordt er gewerkt aan de analyse als input voor de rapportage en de aanbevelingen. In maart 2023 is de rapportage met aanbevelingen gereed en vindt er een bijeenkomst plaats waar de resultaten worden teruggekoppeld aan de gemeenten.
IA38 Ouderen OV en MaaS / Komme	<ul style="list-style-type: none"> Inrichten informatieloket ouderen en OV/MaaS Praktijkdagen OV/MaaS (minimaal 16 per gemeente in de regio Noord-Limburg) 250 deelnemers aan bijeenkomsten/praktijkdagen 	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/01/21- 01/01/24	<ul style="list-style-type: none"> Realisatie van het Komme-programma in Mook en Middelaar met een drietal informatiebijeenkomsten en een Vervoersdag voor ouderen. Aansluiting bij OV-Ambassadeurs concept vanuit YMCA, dit conform uitvoering in provincie Gelderland, Overijssel en Flevoland
IA41a Veilig op Weg	<ul style="list-style-type: none"> Opschaling van Veilig op weg naar alle 8 Noord-Limburgse gemeenten 	Investerings-agenda enveloppe 1&2	Beschikt	Afgerond 01/01/21- 01/01/23	<ul style="list-style-type: none"> Er is actief gestuurd om in alle acht gemeenten een campagne te organiseren. Dat is gelukt. Er is inspiratieboekje gemaakt dat op een laagdrempelige manier een beeld geeft van de Veilig op Weg-aanpak. Het project is afgerond en wordt binnenkort opgeleverd met een draaiboek, instructie en materialen zodat gemeenten nu zelf aan de slag kunnen.
IA70 Datagestuurd werken/Data top 15	Het opleveren van een plan van aanpak per gemeente voor het op orde brengen van de digitale	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/04/22- 31/12/23	<ul style="list-style-type: none"> De coördinator geeft invulling aan opgave in nauwe afstemming met het Regionaal Data Team (RDT). Rol van de coördinator is de invulling van de digitaliseringsopgave vormgeven, in nauwe samenwerking met de inliggende wegbeheerders. Binnen het RDT is voor elk data-item een

	beschikbaarheid van de landelijk afgesproken 15 <ul style="list-style-type: none"> • data items voor Mobiliteit en Logistiek 				<p>zogenaamde data-eigenaar aanwezig. Deze ondersteunt mede het proces (wat meer data-technisch).</p> <ul style="list-style-type: none"> • In juni, september en oktober hebben er 4 regionale kennissessies plaatsgevonden (logistiek, parkeren, geplande afwijkingen en maximum snelheden). Het e-book Digitaliseringsopgave is bekend bij de wegbeheerders. Deze bevat per werksessie instructies/presentaties op welke wijze data dient worden gecheckt/aangeleverd aan (ingerichte) landelijke dataportals. Het e-book wordt steeds geüpdatet na elke regionale kennissessie.
IA71 Continuering Veilig op Weg	<ul style="list-style-type: none"> • Opschaling van Veilig op weg naar alle 8 Noord-Limburgse gemeenten • Alle deelnemende gemeenten in 2022 de aanpak van Veilig op weg eigen hebben gemaakt en geïmplementeerd hebben in de eigen organisatie. 	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/01/22-31/12/22	<ul style="list-style-type: none"> • Er is actief gestuurd om in alle acht gemeenten een campagne te organiseren. Dat is gelukt. • Er is inspiratieboekje gemaakt dat op een laagdrempelige manier een beeld geeft van de Veilig op Weg-aanpak. • Het project is afgerond en wordt binnenkort opgeleverd met een draaiboek, instructie en materialen zodat gemeenten nu zelf aan de slag kunnen
IA072 Continuering Logistieke aanpak 1e helft 2022		Investerings-agenda enveloppe 2	Subsidie-aanvraag in voorbereiding		
IA073 Continuering Werkgeversaanpak 1e helft 2022		Investerings-agenda enveloppe 2	Subsidie-aanvraag in voorbereiding		
IA074 Continuering Bezoekersaanpak 1e helft 2022		Investerings-agenda enveloppe 2	Subsidie-aanvraag in voorbereiding		
IA86 Veilige, slimme en duurzame mobiliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Bestaat uit de projecten: • Werkgeversaanpak • Fietsstimulering • Logistieke aanpak • Zero-emissie stadsdistributie 	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 30/11/21-31/12/23	<p>De middelen van dit project worden ingezet op de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkgeversaanpak • Logistieke aanpak • Zero- emissie stadslogistiek

					<ul style="list-style-type: none"> • Fietsstimulering <p>De eerste drie projecten maken onderdeel uit van andere projecten (IA34 en IA35a). De middelen van die projecten zijn nog niet volledig besteed zodat de middelen en inzet vanuit dit project nog niet nodig zijn.</p> <p>In het kader van fietsstimulering is het project Probeer een E-bike opgestart. Het platform Probeer een e-bike is uitgebouwd voor Noord-Limburg en het aanbod vanuit de twee Noord-Limburgse handelaren is toegevoegd.</p>
IA33 Electric Green Last Mile (EGLM)		Investerings-agenda enveloppe 1		Stop-gezet	<ul style="list-style-type: none"> • In Venray is een ultrasnellader geplaatst, met een sluitende businesscase. • In Venlo is het project niet van de grond gekomen, omdat er niet voldoende capaciteit op het net geleverd kon worden. • Het project is gestopt, omdat de Interreg-subsidie termijn is gestopt. Deze subsidie werd alleen uitgekeerd als beide laders gerealiseerd zouden worden.
IA39 Social Green		Investerings-agenda enveloppe 1		Stop-gezet	<ul style="list-style-type: none"> • Social Green is niet realiseerbaar: <ul style="list-style-type: none"> ○ Niet uitvoerbaar met 'goedkope' elektrische auto's ○ Geen haalbare businesscase voor sociale klasse • Het project is stopgezet. Er wordt gewerkt aan een aangepast plan om deelvervoer voor inwoners te realiseren.
IA096 Doorontwikkeling Industriehaven Venlo		Investerings-agenda enveloppe 3	Subsidie-aanvraag in voorbereiding		<ul style="list-style-type: none"> • Regionale Kick-off workshop PIONEERS heeft plaatsgevonden (febr). • Studie Ruimtelijke Planontwikkeling Noordoever Havengebied Venlo is opgestart (juni). • Er is € 1,8 mln Europese CEF-subsidie toegekend voor diverse havenstudies in Venlo (juni). • Er is een beschikking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen voor de kademuur van de bargeterminal (SPUK-regeling kademuren) van € 1 mln extra voor de (andere verankering van de kademuur bij de) uitbreiding van de bargeterminal (juli).

7.6 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor de eerste en tweede enveloppe Investeringsagenda.

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Bezoekersaanpak	€ 50.000	€ 37.500	€ 12.500
De nieuwe toekomst van het platteland	€ 25.000		€ 25.000
Logistieke aanpak	€ 47.732	€ 37.500	€ 10.232
Monitoring en evaluatie Mobiliteit en Logistiek	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000
Onderzoek mobiliteitsarmoede Noord-Limburg	€ 25.390	€ 12.695	€ 12.695
Veilig op weg	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Corridor aanpak in de regio*	€ 61.394	€ 30.697	€ 30.697
Werkgeversaanpak Noord-Limburg	€ 88.661	€ 37.500	€ 51.161
Mobiliteitsportal*	€ 133.018	€ 66.509	€ 66.509
Ouderen OV en MaaS*	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
eGLM E-Green Last Mile bijdrage in Laadinfra	€ 75.870	€ 37.935	€ 37.935
Social Green fase 0 en fase 1*	€ 81.858	€ 40.929	€ 40.929
Onvoorzien*	€ 45.618	€ 22.809	€ 22.809
Subtotaal programma 5	€ 1.059.540	€ 536.574	€ 522.966

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio

Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Datagestuurd werken: Data top-15	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Continuering Veilig op weg 2022	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Veilig en slimme duurzame mobiliteit	€ 64.500	€ 32.250	€ 32.250
Continuering Logistieke aanpak 1e helft 2022	€ 63.146	€ 31.573	€ 31.573
Continuering Werkgeversaanpak 1e helft 2022	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Continuering Bezoekersaanpak 1e helft 2022	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Subtotaal programma 5	€ 277.646	€ 138.823	€ 138.823

Derde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget derde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Doorontwikkeling industriehaven Venlo	€ 900.000	€ 450.000	€ 450.000
Subtotaal programma 5	€ 900.000	€ 450.000	€ 450.000

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

8



Energie en
klimaat

Energie en Klimaat: Gezond Leefklimaat


8.1 Inleiding

Het programma Energie en Klimaat beoogt het stimuleren van de energietransitie en klimaatadaptatie in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) worden concrete doelstellingen voor de regio Noord- en Midden-Limburg ten aanzien van elektriciteit en warmte vastgesteld. Een deel van deze doelstellingen wordt gerealiseerd binnen het programma Energie en Klimaat in Noord-Limburg.

Voor klimaatadaptatie luidt de regionale ambitie dat alle gemeenten in 2020 klimaatbestendig handelen en in 2050 (zo goed mogelijk) klimaatbestendig zijn. Door hoogwaterveiligheid te bevorderen is de regio in 2050 beschermd tegen overstromingen door het verruimen van rivieren of het aanleggen of versterken van dijken.

De programmadoelen zijn als volgt opgebouwd:

FIGUUR 14. PROGRAMMALIJNEN EN -DOELEN ENERGIE EN KLIMAAT

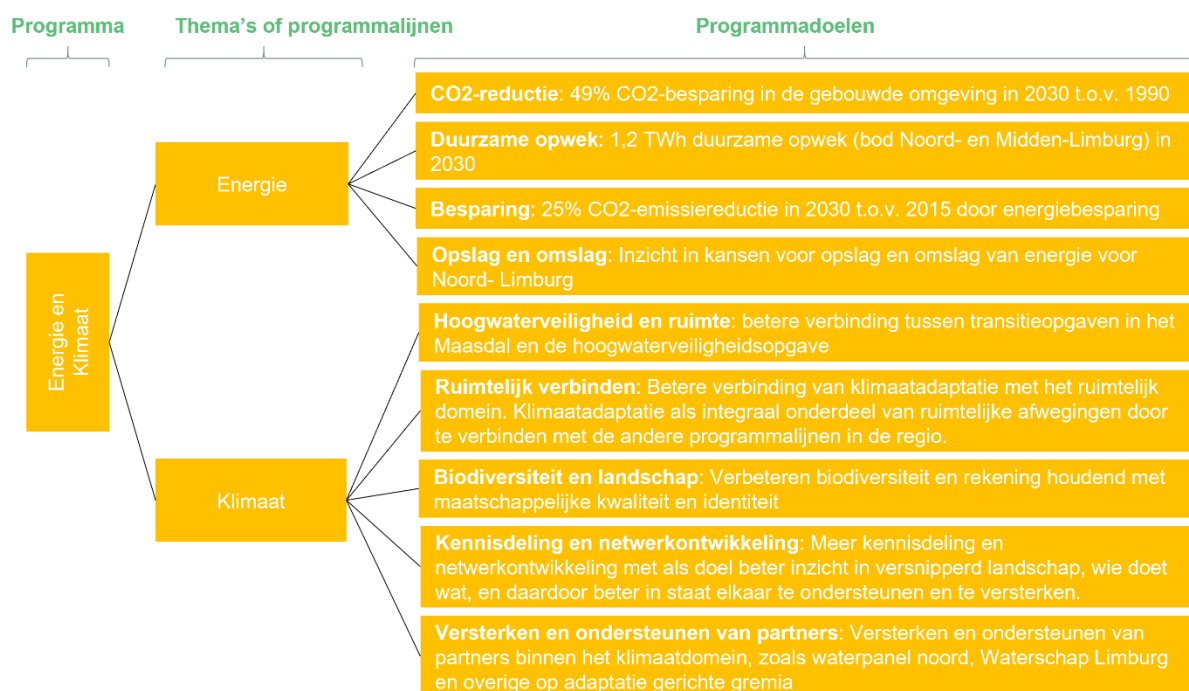

8.2 Ontwikkeling Brede Welvaart

FIGUUR 15. CBS DATA BREDE WELVAART ENERGIE EN KLIMAAT

Milieu	
Natuurgebied per inwoner (2017) 63,0 ha 7^e van de 39	Emissies van fijnstof naar lucht (2020) 400 kg PM_{2,5} per km² 17^e van de 39
Afstand tot openbaar groen (2017) 0,5 km 13^e van de 40	Natuur- en bosgebieden (2017) 21,3% 7^e van de 40
Broeikasgasemissies per inwoner (2020) 10,0 ton CO₂-equivalent 27^e van de 40	Kwaliteit van zwemwater binnenwateren (2021) 4 (uitstekend) 1^e van de 40

N.BDe nummering geeft de positie aan van de Regio Noord-Limburg ten opzichte van andere COROP-regio's. Deze brede-welvaartindicatoren geven veranderingen in de statistieken weer. Dit vraagt om een zorgvuldige interpretatie, immers het aantonen van causaliteit (oorzaak en gevolg) en eventuele correlatie (statistische samenhang) vereist nader onderzoek.

8.3 Voortgang Programma

Net als voor het programma Landelijk Gebied en Veiligheid is in 2022 nagedacht over de toekomst van de uitvoering voor het programma Energie en Klimaat, voor 2024-2027. Er zijn veel raakvlakken tussen de programmaliijn Landelijk Gebied en Klimaat. Vanaf 2024 wordt Landelijk Gebied losgekoppeld van Veiligheid en samengevoegd met Klimaat tot het programma Ruimte.

Programmaliijn Energie

De voortgang richting de vier programmadoelen van de programmaliijn Energie is nog altijd positief. Deze doelen komen overeen met de doelen van de Regionale Energie Strategie (RES), die onderzoekt hoe we meer energie kunnen besparen, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken met zon en wind en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen. Daarom is besloten om de RES leidend te maken in welke projecten er binnen de Investeringsagenda door de programmaliijn Energie worden opgepakt. De RES beslaat echter de vijftien gemeenten van Noord- en Midden-Limburg, waardoor sommige projecten voor een deel uit de Investeringsagenda van Noord-Limburg worden gefinancierd en voor een deel elders.

In de projecten loopt men nog wel tegen enkele zaken aan die invloed hebben op de voortgang van de programmaliijn. Zo zijn er in 2020 en 2021 veel fysieke bijeenkomsten niet doorgegaan vanwege corona. Hierdoor hebben sommige projecten uitstel aangevraagd. In 2022 is een grote inhaalslag gemaakt met het organiseren van die bijeenkomsten.

Desondanks zorgt dit niet voor grote vertragingen in de projecten. De regio ligt al op koers om 70% van het bod voor de RES te realiseren, ontwikkelingen op energiebesparingen gaan voorspoedig en er worden vooralsnog geen problemen met netcongestie verwacht, ten aanzien van het bod tot 2030. Voor de ambitie projecten die op de rol staan voor na 2030 voorziet men wel problemen ten aanzien van netcongestie. Daarnaast wordt er een projectbureau opgetuigd vanuit de RES 2.0 om invulling te

geven aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Dit bureau ondersteunt de verschillende gemeenten om landelijke aanvragen te doen bij dit NIP.

Programmalijn Klimaat

Het afgelopen jaar, 2022, stond voor de programmalijn Klimaat vooral in het teken van de oplevering van het nieuwe uitvoeringsprogramma 2024-2027. De overlap tussen de programma's Landelijk Gebied en de programmalijn Klimaat wordt vanaf 2024 het nieuwe programma Ruimte.

Daarnaast zijn er in de programmalijn Klimaat twee projecten opgestart in de tweede enveloppe van de Investeringsagenda. In het project Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" is een rapport met ontwikkelperspectief opgeleverd voor het gebied tussen de Peelvenen en de Maas in Noord-Limburg, die binnen en buiten de regio erg positief is ontvangen. In dit rapport worden enkele scenario's geschetst die richting geven om verschillende vraagstukken – landbouw, natuur, energie en water – aan te pakken.. Dit rapport kan als blauwdruk fungeren voor hoe het ruimtelijk voorstel van de Provincie Limburg eruit kan komen te zien. De ambitie van het toekomstige programma Ruimte is ook om mee te helpen aan de uitwerking en implementatie van dit ruimtelijk voorstel.

8.4 Samenwerking en Proces

Programmalijn Energie

Binnen de programmalijn Energie worden veel verschillende stakeholders betrokken. Een voorbeeld is van het projectbureau voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), waar veertien gemeenten in mee werken en door zijn geholpen. Zo wordt er op lokaal niveau goed samengewerkt, maar ook de provincie wordt betrokken bij dit soort vraagstukken.

Op dit moment wordt er ook al samengewerkt met andere programma's. Dit geldt zeker waar de overlap heel evident is, zoals bij het programma Mobiliteit en Logistiek. De ambitie is om deze samenwerking in de komende jaren nog verder uit te breiden en de verbinding tussen alle programma's verder te versterken.

Programmalijn Klimaat

De samenwerking binnen de programmalijn Klimaat was vaak uitdagend. Het thema klimaat en ruimte is bestuurlijk zeer versnipperd, wat het moeilijk maakt om hier als één geheel in op te treden. Kennisdeling is dan ook een belangrijk doel van de programmalijn, om bestuurders en betrokkenen op de hoogte te brengen van het bredere verhaal. In 2022 zijn hier via het proces van de gebiedsgerichte aanpak wel stappen gezet, maar een bredere integratie van klimaat in ruimte staat pas voor 2023 op de rol. De urgentie voor het thema groeit, door onder meer de stikstof-, landbouw en woningbouwcrisis. En de verwachting is dat de doorstart naar het Programma Ruimte voor een nieuwe impuls in de samenwerking zal zorgen.

8.5 Voortgang en ontwikkelingen per project

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Termijn/ Enveloppe	Beschikt?	Status	Voortgang
IA042 RES 1.0	In 2030 minimaal 25% minder CO ₂ uitstoten dan in 2015. Met grootschalige zon- en windprojecten 1.200 GWh duurzame energie opwekken in 2030. Minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige zon- en windprojecten op regionaal niveau. 100% duurzame warmte in 2050 voor alle woningen/gebouwen.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/06/21 - 01/06/23	Vanuit de bijdrage van de investeringsagenda waren in de periode juli 2021 tot maart 2022 al twee onderzoeken opgestart naar alternatieve warmtebronnen: groengas en aquathermie. Dit vormt de basis voor de analyse van de transitievisies warmte (TVW). De resterende subsidie is ingezet op het thema kennisdeling door het bouwen van een community of praktisch. Met deze community of praktisch zet de RES gericht in op het delen van kennis binnen de organisatie.
IA043 Energie-landschappen	Medio 2022: inzicht in haalbaarheid drie energie landschappen 2030: Drie energieke landschappen gerealiseerd (met significante bijdrage aan RES doel)	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/06/21- 01/01/24	Er is een narratief opgesteld voor energieke landschappen, die vertaald zijn naar regiogemeente. Deze is inmiddels afgerond en verfilmd. Daarnaast wordt er op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar meervoudig ruimte gebruik binnen de energieke landschappen in Noord- Limburg. Het onderzoek gaat in op de gewenste doelen en resultaten van een onderzoek naar meervoudig ruimte gebruik. Onder dit onderzoek valt ook een additioneel onderzoek naar de effecten van zonnepanelen op de bodem. Voor een onderzoek naar lokaal eigendom in de energietransitie is voorlopig nog niet voldoende informatie. Deze wordt vooralsnog niet actief opgepakt.
IA044 Charter Energie MKB	Contact met 175 bedrijven inzake (de regelgeving en kansen van) de energietransitie. Drie workshops geven.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/07/21- 01/07/24	Er is vooral focus gelegd op de uitvoering van activiteiten. Na de zomer van 2022 (wegvallen vele corona-beperkingen) is er ook weer fysieke bijeenkomsten gaan organiseren en zijn er vele keukentafelgesprekken gevoerd met ondernemers. In praktijk is een duidelijke behoefte bij ondernemers te

	Pool van ambassadeurs opzetten. 25 energiescans uitvoeren. Twee pilots starten inzake energiebesparing op bedrijventerreinen.				constateren om eerst in persoonlijk gesprek te gaan en te bezien welke problemen er leven en hoe deze opgepakt kunnen worden. Bij bedrijven is de energietransitie ook breder dan alleen maar een energie-technisch vraagstuk; ook financiële, strategische, marketing en vergunningsaspecten spelen mee.
IA045 Opslag en omslag energie	Eind 2022: inzicht in mogelijkheden opslag en omslag bij energieke landschappen.	Investerings-agenda enveloppe 1	Beschikt	Lopend 01/06/21- 01/01/24	Ten aanzien van opslag en omslag van energie lopen er een aantal sporen: 1) Rapport met inzicht in de mogelijkheden voor opslag en omslag van energie in Noord-Limburg, inclusief een verkenning van de mogelijkheden voor (locaties voor) pilots. a. Als Regio Noord- Limburg zijn we betrokken bij een verkenning voor Limburg (door de provincie) omtrent opslag en omslag van energie. Op basis van deze verkenning kijken we hoe we de koppeling kunnen maken met lokale vraagstukken. 2) Er is een bijeenkomst georganiseerd voor de installatie sector om samen na te denken over de kansen in de energietransitie en specifiek ook naar opslag en omslag.
IA078a Gebieds-ontwikkeling 't Brook	Oplevering van verkenningen voor zowel de gemeente Beesel als de gemeente Venlo. Oplevering van een routekaart voor het vervolgproces van de gebiedsverkenning	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 30/11/21- 01/01/24	De verkenning voor het gedeelte in Beesel en Venlo is opgeleverd. Met de routekaart wordt in 2023 gestart.
IA079 Gebieds-ontwikkeling de Peel	Oplevering van verkenningen voor zowel de gemeente Horst aan de Maas als de gemeente Venray. Oplevering van een routekaart voor het vervolgproces van de gebiedsverkenning	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 30/11/21- 01/01/24	In Horst aan de Maas is de gebiedsverkenning uitgevoerd, in Venray is hier opdracht toe gegeven. De afbakening in Horst aan de Maas is verbreed van enkel zonne-energie naar: de stikstofopgave, verandering van agrarische activiteiten, natuurontwikkeling, wateropgave, recreatie en leefbaarheid. Daarnaast houden de twee gemeenten elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen om een gezamenlijke routekaart op te stellen.

IA081 Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen	Het opstellen van een goede governance en diverse uitvoeringplannen. Het versterken van de natuurwaarde is de basis, waarbij de balans gezocht wordt tussen duurzame economische ontwikkeling en biodiversiteit, waterveiligheid en de leefbaarheid van kernen.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Lopend 01/01/22- 31/12/23	
IA082 Gebiedsgerichte aanpak Ontginnings-gebieden	Zicht geven op het perspectief voor de ontwikkeling van het gebied; ervaring opdoen in het integraal verbinden van sectoraal uitgewerkt beleid; richting geven aan bestuurlijke keuzes, zowel in de zin van ruimtelijke structuur als in de zin van investeringen.	Investerings-agenda enveloppe 2	Beschikt	Afgerond 01/01/22- 01/06/22	Ter afsluiting van het project is een concept opgeleverd van het document: <i>Tussen Peelvenen en Maasvallei; Een ontwikkelperspectief voor de ontginningsgebieden in Noord-Limburg.</i>
IA097 Gebiedsgerichte aanpak Ontginnings-gebieden (Vervolg)		Investerings-agenda enveloppe 3	Subsidie-aanvraag in voorbereiding		
IA114 Onderzoek woningen verduurzamen met kleinschalige collectieve All-electric oplossingen		Investerings-agenda enveloppe 4	Subsidie-aanvraag in voorbereiding		

8.6 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor de eerste en tweede enveloppe Investeringsagenda.

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Charter Energietransitie MKB	€ 256.800	€ 156.800	€ 100.000
Energie opslag en omslag Noord- Limburg	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Energie landschappen Noord- Limburg	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
RES 1.0 en doorvertaling naar de uitvoering	€ 65.000		€ 65.000
Subtotaal programma 6	€ 521.800	€ 256.800	€ 265.000

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen Nieuwe Stijl	€ 44.935	€ 25.000	€ 19.935
Energieke gebiedsontwikkeling 'T Brook, Venlo	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000
Energieke gebiedsontwikkeling de Peel, Venray	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Energieke gebiedsontwikkeling de Peel, Horst aan de Maas	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen Nieuwe Stijl	€ 333.000	€ 133.000	€ 200.000
Energieke gebiedsontwikkeling 'T Brook Beesel	€ 50.000	€ -	€ 50.000
Subtotaal programma 6	€ 777.935	€ 358.000	€ 419.935

Derde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget derde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (vervolg)	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000
Subtotaal programma 6	€ 900.000	€ 450.000	€ 450.000

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

provincie limburg



rn—|

Regio
Noord-Limburg



rn—l
Regio Noord-Limburg

Partner in

**GEZONDSTE
REGIO**



Samenvatting Voortgangsrapportage Noord Limburg 2022


Juli 2023



De acht gemeenten in Noord-Limburg werken samen met het Rijk, de Provincie Limburg, bedrijven en maatschappelijke partners aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Hiervoor is de Regiovisie 2040 opgesteld, waarin de acht Noord-Limburgse gemeenten beschrijven hoe zij kunnen samenwerken om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Om dit te bereiken, zijn de juiste instrumenten nodig. Tussen het Rijk, de Provincie en de Regio is hiervoor een Regio Deal gesloten en tussen de Provincie en de Regio is een Investeringsagenda opgesteld. Vanuit de Regio Deal en Investeringsagenda wordt een groot aantal activiteiten en projecten uitgevoerd. Onderdeel van de Regio Deal en de Investeringsagenda is de afspraak om de voortgang ervan te monitoren. De voortgangsrapportage over 2022 beschrijft de voortgang van alle programma's en projecten die onder de Investeringsagenda en de Regio Deal vallen.

De samenwerking in de Regio Noord-Limburg uit de Regiovisie 2040 is verder uitgewerkt in Uitvoeringsprogramma's die elke vier jaar worden herzien. Momenteel is dit het Uitvoeringsprogramma 'de Gezondste regio' 2020-2023. In dit uitvoeringsprogramma zijn projecten opgenomen waarmee de betrokken partijen werken aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg.

Om het geheel te sturen, zijn er zes programma's opgezet, waarbinnen de verschillende projecten vallen. Onder de Regio Deal hangen vijf thema's en vanuit de Investeringsagenda wordt samengewerkt in zes programma's, met elk twee tot vijf programmalijnen. De figuur hiernaast geeft een overzicht van de programma's en thema's, en de samenhang daartussen.

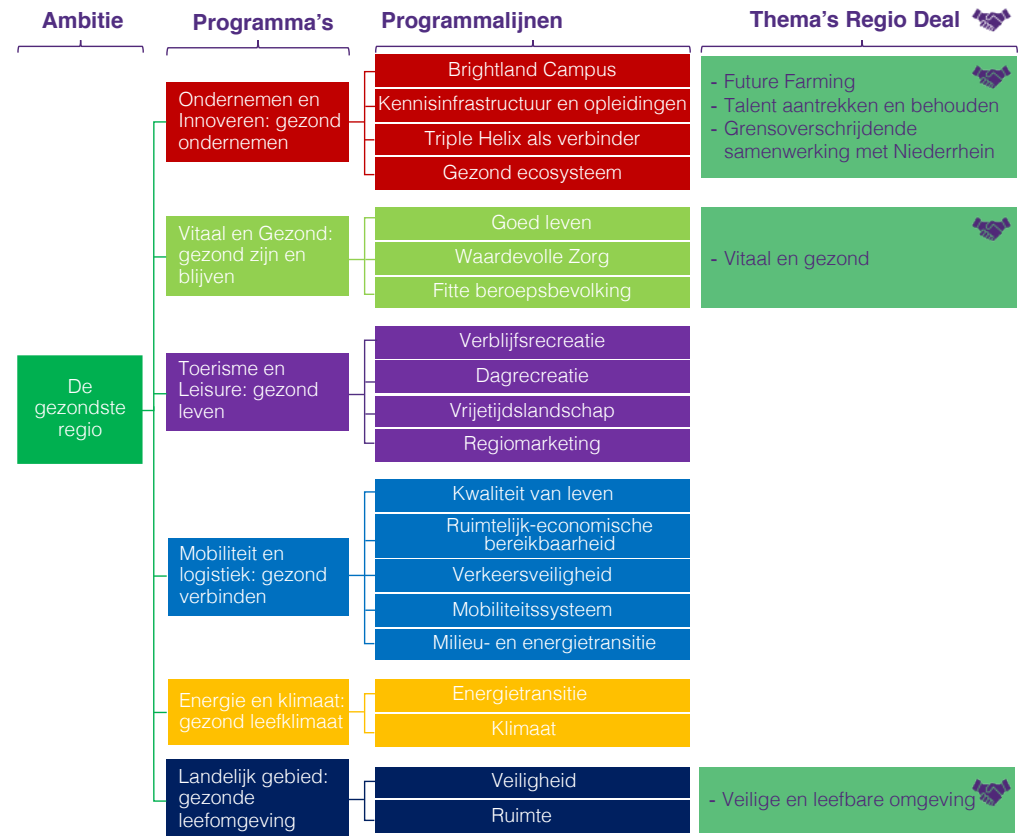

De tabel hieronder geeft het totaaloverzicht van de financiën en uitgevoerde projecten. In totaal wordt er met de Regio Deal en Investeringsagenda ruim € 60 miljoen euro gefinancierd. Met dat geld worden 108 projecten uitgevoerd die eraan bijdragen om Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken. Op de volgende pagina's leest u meer over de zes programma en de projecten.

	Aantal projecten	Totaal-budget	Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio	Bijdrage Provincie
Regio Deal					
1 ^e termijn	19	€ 19.417.251	€ 9.518.626	€ 9.898.626	
2 ^e termijn	19	€ 17.113.107	€ 7.842.068	€ 9.131.734	
Investeringsagenda					
1 ^e enveloppe	36	€ 12.759.062		€ 4.434.293	€ 4.427.349
2 ^e enveloppe	32	€ 7.785.276		€ 4.031.150	€ 3.754.126
3 ^e enveloppe	3	€1.050.000		€ 525.000	€ 525.000



PROGRAMMA 1

Ondernemen en Innoveren: Gezond Ondernemen

Het programma Ondernemen en Innoveren richt zich op de ontwikkeling van Noord-Limburg tot een unieke en innovatieve regio binnen beeldbepalende economische sectoren. Daarvoor stimuleren wij de doorontwikkeling van kennisinfrastructuur en opleidingen en het aantrekken en binden van talent. En we werken aan het opbouwen van een gezond innovatie-ecosysteem in de regio. Dit alles doen we volgens het triple-helix-principe: in (grensoverschrijdende) samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid. Die samenwerking vergt tijd en aandacht: je moet leren elkaars taal te spreken. Maar inmiddels begint het ook zijn vruchten af te werpen.

Zo wordt gewerkt aan de realisatie van het onderzoekslaboratorium Blue Plasma Center. Bij de bacheloropleiding Gezondheid is het afgelopen jaar de tweede cohort studenten gestart. En de Universiteit Maastricht ontwikkelt een bachelor Sustainable Bioscience en - samen met de Radboud Universiteit Nijmegen - een master Crop Biotechnology and Engineering. De doorontwikkeling van de Brightlands Campus fungeert daarbij als vliegwiel. Hiermee stimuleert Noord-Limburg de regionale samenwerking, goede opleidingen, uitdagende banen en een prettige omgeving om in te wonen en in te werken.

Projecten

Project	Termijn/ Enveloppe	Status aanvraag	Status/Looptijd	Bedragen
Bachelor opleiding gezondheid	IA 1	Beschikt	01/09/21 - 28/02/23	€ 437.834
LINT	IA 1	Beschikt	01/09/22 - 31/12/25	€ 624.333
Data Science & AI Academy	IA 1	Beschikt	01/09/21 - 01/09/24	€ 465.500
Blue plasma	IA 1	Beschikt	01/01/22 - 31/12/24	€ 105.000
BISCI	IA 2	Beschikt	01/04/22 - 31/12/25	€ 41.950
Pilot circulaire ambachten	IA 2	Beschikt	01/01/22 - 01/01/24	€ 355.000
Verbonden Peelproeftuinen	IA 3	In voorbereiding		€ 50.000
Brightlands Institute for the Future of Farming	RD 1	Beschikt	01/11/20 - 01/01/24	€ 10.000.000
Fieldlab Future Farming	RD 1	Beschikt	01/09/20 - 31/12/23	€ 975.525
Fieldlab Voeding en Gezondheid	RD 1	Beschikt	01/09/20 - 31/12/23	€ 881.520
Fieldlab Technological innovation & smart logistics	RD 1	Beschikt	01/09/20 - 31/12/23	€ 839.100
Fieldlab Grensoverschrijdend ondernemen	RD 1	Beschikt	01/09/20 - 31/12/23	€ 680.740
Gilde International	RD 1	Beschikt	01/09/20 - 01/09/21	€ 190.366
BCGV: Kas t.b.v. shared facilities	RD 2	In voorbereiding		€ 2.500.000
Poultry Research Center	RD 2	In voorbereiding		€ 1.000.000
BCGV: Doorontwikkeling Test- en tastecentrum	RD 2	Beschikt	01/12/22 - 31/12/25	€ 1.250.000
BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant	RD 2	In voorbereiding		€ 350.000
BCGV: Facilities	RD 2	Deels beschikt	01/01/23 - 01/01/25	€ 3.200.000
Regio in je Rugzak	RD 2	In voorbereiding		€ 416.150
Meet The Youngsters	RD 2	Beschikt	01/04/22 - 31/12/23	€ 259.957
Traineeprogramma Noord-Limburg	RD 2	Beschikt	01/09/22 - 31/12/25	€ 400.000
Fieldlab Circular Innovation	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/23	€ 950.000
Gilde grenscollege fase 2	RD 2	Beschikt	01/09/21 - 31/08/24	€ 312.350
Euregional Sustainability Center	RD 2	Beschikt	01/09/22 - 31/08/24	€ 450.000
Euregio Toolkit	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/23	€ 265.776
Triple Helix/Quatro helix	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/23	€ 950.000

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de enveloppe aangeeft RD = Regio Deal, waarbij het nummer de termijn aangeeft

■ Project is afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project is vertraagd
 ■ Project is geannuleerd



PROGRAMMA 2

Vitaal en gezond

Het programma Vitaal en Gezond bestaat uit drie programmalijnen: Goed Leven, Waardevolle Zorg en Fitte Beroepsbevolking. Met het programma Vitaal en Gezond werken wij zo aan een regio waarin het vanzelfsprekend is dat we samen zorgen voor elkaar, en waar iedereen van jong tot oud naar eigen vermogen mee kan doen.

Voor Goed Leven investeren wij in cultuur, pakken wij sociale vragen in wijken aan en stimuleren we gezonde keuzes, met name onder kinderen en jeugd. Waardevolle Zorg bereiken wij door het ontwikkelen van nieuwe zorgtechnologieën, het verbeteren van zorg voor nieuwe ouders en verdere verbetering van de huisartsenzorg. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid verwijzen huisartsen kwetsbare burgers met niet-medische hulpvragen bijvoorbeeld door naar burgerinitiatieven. De programmalijn Fitte Beroepsbevolking is erop gericht om (kwetsbare) jongeren, arbeidsmigranten, herintreders en carrièreswitchers te ondersteunen, bijvoorbeeld met taalcursussen. In een leer-ontwikkel-netwerk leren de betrokken inwoners, gemeenschappen, ondernemers en beroepskrachten elkaar kennen, en wisselen zij ervaringen en expertises uit. Op deze wijze wordt in relaties geïnvesteerd en ontstaat er een netwerksamenwerking tussen mensen.

Projecten

Project	Termijn/ Enveloppe	Status aanvraag	Status/Looptijd	Bedragen
Leren, werken en ontwikkelen Peel en Maas	IA 1	Beschikt	01/07/21 - 01/01/24	€ 437.834
Leren, werken en ontwikkelen Venray	IA 1	Beschikt	01/01/20 - 01/07/24	€ 624.333
Leren, werken en ontwikkelen Gennep	IA 1	Beschikt	01/01/21 - 01/01/24	€ 465.500
Zorgeloos wonen	IA 1	Beschikt	01/09/22 - 31/12/23	€ 105.000
Cultuur op recept	IA 1	Beschikt	22/03/22 - 31/12/23	€ 41.950
Transformatieplan Jeugd	IA 1	Beschikt	01/01/21 - 30/06/24	€ 355.000
Integrale wijkaanpak Horst	IA 1	Beschikt	01/01/21 - 01/01/24	€ 50.000
Integrale wijkaanpak Venray	IA 1	Beschikt	01/01/21 - 01/01/24	€ 50.000
Servicepunt Internationale werknemers	IA 2	Beschikt	01/01/21 - 01/01/24	€ 180.000
Wijkaanpak Gennep	IA 2	Beschikt	01/01/22 - 01/01/24	€ 419.400
Preventieakkoord	IA 2	Beschikt	30/11/21 - 31/12/23	€ 520.000
10.000 talenplan	IA 2	Beschikt	01/10/22 - 31/12/23	€ 76.000
Vitaliteitscoöperatie America Left	IA 2	Beschikt	30/11/21 - 31/12/22	€ 142.500
Ontwikkelplan Gezondste Regio 2020-2022	RD 1	Beschikt	01/01/20 - 01/01/23	€ 980.000
Burgerinitiatieven en Positieve Gezondheid in de huisartsenzorg	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 01/01/24	€ 1.090.000
Programma Jeugd, Voeding & Gezondheid	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 01/01/24	€ 2.500.000
LiFi / GBT: Limburg Fit / Gezondste Basisschool van de toekomst	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 31/12/23	€ 2.986.568

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de enveloppe aangeeft RD = Regio Deal, waarbij het nummer de termijn aangeeft

■ Project is afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project is verstraagd
 ■ Project is geannuleerd



PROGRAMMA 3

Toerisme en Leisure: Gezond Leven

De Regio Noord-Limburg streeft naar een vitale toerisme- en leisuresector die een sociaaleconomische motor vormt voor de regio en bijdraagt aan een gezond leven. Noord-Limburg wil in 2025 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied voor shortbreak vakanties zijn, met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen. Daarbij focust de regio op eigentijdse en hoogwaardige familierecreatie. De inspanningen moeten leiden tot een groei van de jaarlijkse vrijetijdsbestedingen in de regio naar ruim €1 miljard in 2025.


Daarvoor investeren we in recreatiemogelijkheden en vrijetijdslandschappen in de regio. Zo ontwikkelen we mountainbikeroutes, fiets- en wandelpaden. Waar mogelijk werken we samen met andere sectoren, bijvoorbeeld met de landbouw via het Platform Agrotourisme en met de keramiekindustrie. Dit alles wordt ondersteund met effectieve regiomarketing en de ontwikkeling van VVV Inspiratiepunten.

Projecten

Project	Termijn/ Enveloppe	Status aanvraag	Status/Looptijd	Bedragen
Toeristische Overstappunten (TOPs)	IA 1	Beschikt	Afgerond	€ 437.834
Crossover Agrofood en Leisure	IA 1	Beschikt	Afgerond	€ 624.333
Kwaliteits-verbetering Veer Reuver	IA 1	Beschikt	Afgerond	€ 465.500
Platform Agrotourisme	IA 2	Beschikt	01/03/22-31/12/23	€ 105.000
Vrijetijdspark Ooijen-Wanssum	IA 2	Beschikt	In voorbereiding	€ 41.950
Venlo Convention Bureau	IA 2	Beschikt	30/11/21-30/06/23	€ 355.000
Keramiekindustrie	IA 2	Beschikt	Geen voortgang over 2022	€ 50.000
Genneper Huys	IA 2	Beschikt	Geen voortgang over 2022	€ 600.000
Groene Hart Musschenberg	IA 2	Beschikt	30/11/21-01/01/24	€ 200.000
TOP's	IA 2	Beschikt	30/11/21-31/12/24	€ 975.525
Regionale MTB-route	IA 2	Beschikt	01/04/22-31/12/24	€ 881.520
VVV Inspiratiepunt Beesel	IA 2	Beschikt	Afgerond	€ 839.100

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de enveloppe aangeeft RD = Regio Deal, waarbij het nummer de termijn aangeeft

■ Project is afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project is vertraagd
 ■ Project is geannuleerd

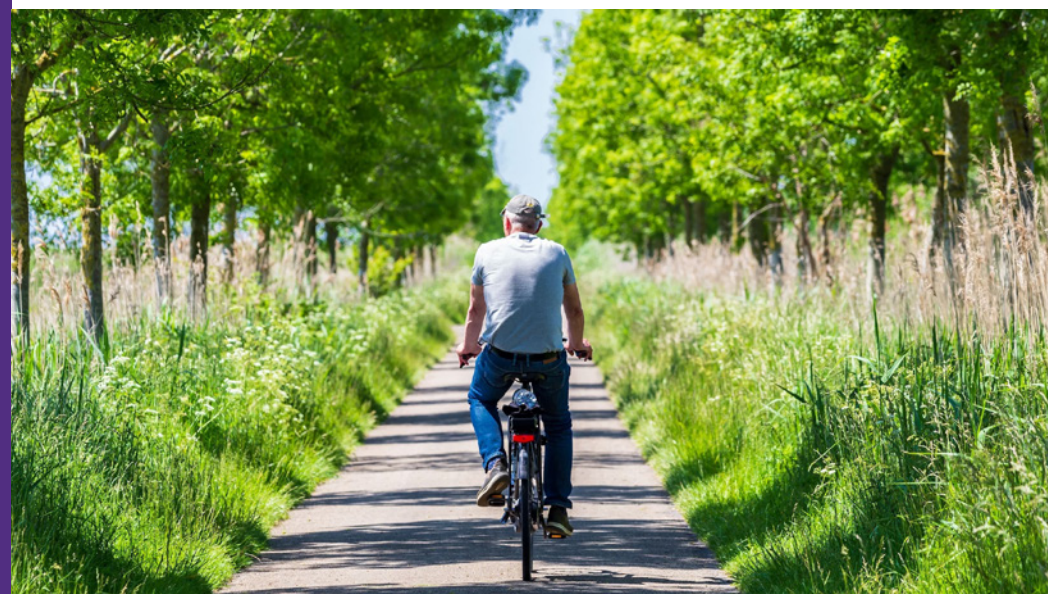



PROGRAMMA 4

Landelijk Gebied: Gezonde Leefomgeving

Het programma Landelijk Gebied bestaat uit twee lijnen: Ruimte en Veiligheid. De programmaliijn Ruimte richt zich op een landelijk gebied met een hogere natuur- en cultuurhistorische kwaliteit, met ruimte voor economische activiteiten en ruimte voor eisen die de energietransitie, de transformatie in de agrarische sector, waterveiligheid en waterkwaliteit stellen. Zo herstellen we het karakteristieke Maasheggen-landschap aan de oostoever van de Maas.

De programmaliijn Veiligheid zet in op het versterken van de informatiepositie op het gebied van veiligheid, het vergroten van bewustzijn over signalen die kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten en het stimuleren van meldingsbereidheid. We ondersteunen stoppende agrariërs en stimuleren de transformatie van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties. En we ontwikkelen innovatieve controlemethoden en nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeenten en andere partners om ondermijning tegen te gaan.

Projecten

Project	Termijn/ Enveloppe	Status aanvraag	Status/Looptijd	Bedragen
Regionaal InterventieTeam ACT! (RIT)	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 31/12/25	€ 640.000
Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO)	RD 1	Beschikt	Afgerond, wordt vervolgd	€ 120.000
Innovatieve Controlemethoden	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 31/12/25	€ 50.000
Data Driven Opsporings-methoden	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 31/12/25	€ 75.000
Bewustwording Meld Misdaad Anoniem (MMA)	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 31/12/25	€ 150.000
Verbeteren van de integratie en participatie Internationale Werknemers	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 31/12/25	€ 25.000
Brochure Bewustwording signalen ondermijning	RD 1	Beschikt	01/01/21 - 31/12/25	€ 10.000
Rode en Groene Spoor Vakantieparken	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/25	€ 538.000
Innovatie aanpak synthetische drugscriminaliteit Fase 2	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/25	€ 600.000
Procesbegeleiding en uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen – Buitengebied	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/25	€ 150.000
Restorative Justice: Herstelconferenties Noord-Limburg	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/25	€ 100.000
Toekomstperspectief Locaties Stoppende Agrarische Ondernemers (TSAO)	RD 2	Beschikt	01/01/22 - 31/12/25	€ 145.000
Grenzeloos meten	IA 1	Beschikt	01/01/21-31/12/24	€ 200.000
Maatwerkversneller voor het landelijk gebied	IA 1	Beschikt	01/12/21-01/12/24	€ 50.000
Maasheggen (Bergen, Gennep, Mook & Middelaar)	IA 1	Beschikt	01/12/21-31/12/25	€ 3.500.000

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de enveloppe aangeeft RD = Regio Deal, waarbij het nummer de termijn aangeeft

■ Project is afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project is vertraagd
 ■ Project is geannuleerd



PROGRAMMA 5

Mobiliteit en Logistiek: Gezond Verbinden

Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit de klimaatvriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn met gezonde verbindingen binnen en naar de regio. Mobiliteit is geen doel op zich, maar levert een belangrijke randvoorwaardelijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden in Noord-Limburg. Daarbij streven we ernaar om ons mobiliteitssysteem zo betrouwbaar, veilig en schoon mogelijk te maken.

We werken onder meer aan de bestrijding van mobiliteitsarmoede en het faciliteren van OV-gebruik voor ouderen. En ondersteunen werkgevers bij het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid. De uitvoering van het programma Mobiliteit en Logistiek valt onder Programmabureau Trendsportal, dat onderdeel is van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Noord-Limburgse gemeenten.

Projecten

Project	Termijn/ Enveloppe	Status aanvraag	Status/Looptijd	Bedragen
Bezoekersaanpak	IA 1&2	Beschikt	01/01/21-01/08/23	€ 91.322
Corridoraanpak	IA 1	Beschikt	01/01/21-01/01/24	€ 230.144
Nieuwe toekomst platteland/ Plattelandsdistributie	IA 1	Beschikt	Geannuleerd	€ 25.000
Logistieke aanpak	IA 1&2	Beschikt	01/01/21-01/01/23	€ 89.054
Werkgevers-aanpak	IA 1&2	Beschikt	01/01/21-01/01/24	€ 97.733
Mobiliteitsportal	IA 1&2	Beschikt	01/01/21-01/01/24	€ 304.073
Monitoring en evaluatie	IA 1	Beschikt	01/01/21-01/01/24	€ 300.000
Mobiliteitsarmoede	IA 1	Beschikt	01/01/21-01/07/23	€ 25.390
Ouderen OV en MaaS / Kommee	IA 1	Beschikt	01/01/21-01/01/24	€ 150.000
Veilig op Weg	IA 1&2	Beschikt	Afgerond	€ 25.000
Datagestuurd werken/Data top 15	IA 2	Beschikt	01/04/22-31/12/23	€ 50.000
Continuering Veilig op Weg	IA 2	Beschikt	01/01/22-31/12/22	€ 50.000
Continuering Logistieke aanpak 1e helft 2022	IA 2	In voorbereiding		
Continuering Werkgeversaanpak 1ste helft 2022	IA 2	In voorbereiding		
Continuering Bezoekersaanpak 1ste helft 2022	IA 2	In voorbereiding		
Veilige, slimme en duurzame mobiliteit	IA 2	Beschikt	30/11/21-31/12/23	€ 129.000
Electric Green Last Mile (EGLM)	IA 1		Geannuleerd	
Social Green	IA 1		Geannuleerd	
Doorontwikkeling Industriehaven Venlo	IA 3	In voorbereiding		

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de enveloppe aangeeft RD = Regio Deal, waarbij het nummer de termijn aangeeft

■ Project is afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project is verstraagd
 ■ Project is geannuleerd



PROGRAMMA 6

Energie en Klimaat: Gezond Leefklimaat

Het programma Energie en Klimaat beoogt het stimuleren van de energietransitie en klimaatadaptatie in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) worden concrete doelstellingen voor de regio Noord- en Midden-Limburg ten aanzien van elektriciteit en warmte vastgesteld. Een deel van deze doelstellingen wordt gerealiseerd binnen het programma energie en klimaat in Noord-Limburg. Bijvoorbeeld met een onderzoek naar meervoudig ruimtegebruik voor energielandschappen. En het ondersteunen van het MKB bij de energietransitie.

Voor klimaatadaptatie luidt de regionale ambitie dat alle gemeenten in 2020 klimaatbestendig handelen en in 2050 (zo goed mogelijk) klimaatbestendig zijn. Door hoogwaterveiligheid te bevorderen is de regio in 2050 beschermd tegen overstromingen door het verruimen van rivieren of het aanleggen of versterken van dijken.

Projecten

Project	Termijn/ Enveloppe	Status aanvraag	Status/Looptijd	Bedragen
RES 1.0	IA 1	Beschikt	01/06/21- 01/06/23	€ 65.000
Energie-landschappen	IA 1	Beschikt	01/06/21- 01/01/24	€ 100.000
Charter Energie MKB	IA 1	Beschikt	01/07/21-01/07/24	€ 1.032.470
Opslag en omslag energie	IA 1	Beschikt	01/06/21- 01/01/24	€ 100.000
Gebieds-ontwikkeling 't Brook	IA 2	Beschikt	30/11/21- 01/01/24	€ 150.000
Gebieds-ontwikkeling de Peel	IA 2	Beschikt	30/11/21- 01/01/24	€ 200.000
Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen	IA 2	Beschikt	01/01/22- 31/12/23	€ 800.000
Gebiedsgerichte aanpak Ontginningsgebieden	IA 2	Beschikt	Afgerond	€ 39.870
Gebiedsgerichte aanpak Ontginningsgebieden (Vervolg)	IA 3	In voorbereiding		
Onderzoek woningen verduurzamen met kleinschalige collectieve All-electric oplossingen	IA 4	In voorbereiding		

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de enveloppe aangeeft RD = Regio Deal, waarbij het nummer de termijn aangeeft

■ Project is afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project is vertraagd
 ■ Project is geannuleerd



Gemeenteraad van Venray
Griffie
Postbus 500

5800 AM VENRAY

Concern

Raadhuisstraat 1
Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22
E-mail gemeente@venray.nl
Internet www.venray.nl
KvK-nummer 14132389

IBAN NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)
IBAN NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)
BIC BNGHNL2G

Datum 10 oktober 2023
Ons kenmerk
Pagina 1 van 2

Behandeld door Roel Reijnders
Datum uw brief
Uw kenmerk

Onderwerp Voortgangsrapportage Regio Noord Limburg 2022

Geachte Raadsleden,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgangsrapportage van Regio Noord-Limburg over 2022. Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang van alle programma's en projecten die onder de Investeringsagenda en de Regio Deal vallen. Het Regiobureau heeft in samenwerking met bureau Berenschot deze rapportage vormgegeven om zo goed mogelijk te voldoen aan de informatiebehoefte van colleges en gemeenteraden.

Samenwerken is belangrijker dan ooit; geen enkele partij kan zijn of haar ambities en doelen bereiken zonder slim samen te werken. Ook de maatschappelijke opgaven zijn groter dan ooit. De acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen daarom al enkele jaren de krachten om een positieve impuls te geven aan de brede welvaart in de Noord-Limburg.

De Regio Noord-Limburg is een netwerksamenwerking van acht gemeenten. De Regio Noord-Limburg is geen juridische entiteit. Dat betekent dat alle formele besluitvormende bevoegdheden bij de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn belegd. Er zijn geen bevoegdheden overgedragen aan de samenwerking. Elk college verantwoordt de deelname aan de regionale samenwerking aan de eigen gemeenteraad. De gemeenteraden worden daarnaast via regionale bijeenkomsten en informatiebrieven op de hoogte gehouden van de regionale ontwikkelingen.

Opbouw samenwerking

De samenwerking in de Regio Noord-Limburg is gebaseerd op de Regiovisie 2040 en is verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma dat elke vier jaar wordt geactualiseerd. Momenteel is dit het Uitvoeringsprogramma 'de Gezondste regio 2020-2023'. In het najaar van 2023 wordt het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2024-2027 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn projecten opgenomen waarmee de betrokken partijen werken aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. De projecten worden op verschillende wijzen gefinancierd. Deels gaat dat vanuit de gezamenlijke Investeringsagenda van de acht regiogemeenten en de Provincie Limburg. Voor

andere projecten draagt ook het Rijk bij vanuit de Regio Deal en tot slot ondernemen de gemeenten gezamenlijke activiteiten die buiten de Regio Deal en Investeringsagenda vallen. Om het geheel te sturen, zijn er zes programma's opgezet, waarbinnen de verschillende projecten vallen. De Investeringsagenda sluit aan op deze programma's met elk twee tot vijf programmalijnen. De Regio Deal kent vijf thema's die aansluiten op de doelstellingen van het Rijk en ook passen binnen het uitvoeringsprogramma van de regio.

Werken aan de gezondste regio en brede welvaart

Met de zes programma's, vijf Regio Deal-thema's en de onderliggende projecten wil Noord-Limburg de Gezondste Regio van Nederland worden en zo de brede welvaart verbeteren. Gezondheid in deze context gaat niet alleen over fysieke gezondheid, maar ook over een gezond ondernemersklimaat, de mogelijkheid om te ontspannen, mobiel te blijven, duurzame energieopwekking en een prettige en klimaatbestendige leefomgeving. Met de programma's en projecten wil de regio dan ook – uiteindelijk - maatschappelijke impact realiseren.

Monitoring van projecten Regio Noord-Limburg

De voortgangsrapportage heeft als doel om inzicht te geven in de voortgang van activiteiten en projecten in relatie tot de ontwikkeling van de brede welvaart in Noord-Limburg (in hoeverre realiseren we de beoogde resultaten? wat is de bijdrage hiervan aan de programmadoelen? liggen we op koers?). Op basis hiervan legt de regio jaarlijks verantwoording af aan het Rijk, de Provinciale Staten van Limburg, colleges en gemeenteraden over de besteding van middelen. De informatie helpt om waar nodig om bij te sturen of nieuwe activiteiten en projecten te onderbouwen.

Een samenvatting van deze rapportage treft u als bijlage aan. Hierin zijn de projecten opgenomen van de 1^e en 2^e tranche regiodeal en de 1^e, 2^e en 3^e envelop Investeringsagenda. Daarbij is aangegeven wat de stand van zaken van de projecten is (in voorbereiding/beschikt/in uitvoering/afgerond of geannuleerd) en aan welke programmalijnen de projecten bijdragen.

Als u naar aanleiding hiervan aanvullend informatie wilt hebben, bijvoorbeeld over specifieke projecten, dan kunnen wij u op basis van de uitgebreide rapportage nader informeren.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,

M.C. Uitdehaag

E.G.J. Voorn
